

PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX PPRR

RAPPORT SEMESTRIEL DE SUIVI ET EVALUATION (JANVIER 2010 - JUIN 2010)

A. Avancement d'exécution

Exécution prévue pour le semestre écoulé (sur la base du PTBA 2010)

COMPOSANTE 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX

- Collecter 7,76 tonnes de piments séchés rouges, 1,8 tonnes de piments verts frais, 400 kg de piments rouges frais, 4 tonnes de miel, 380 tonnes de paddy, 4 tonnes d'huiles essentiels et 400 tonnes de maïs, 300 tonnes d'ananas ;
- Construire 6 bâtiments de CAM (Pôles : Boraha ou Sainte Marie, Onibe, Ivondro, Rongaronga, Rianila et Iaroka), 1 bâtiment d'extension avec aires de séchage et un bâtiment de collecte et de conditionnement de miel ;
- Réaliser un chiffre d'affaire de 515 000 USD ;
- Former 120 membres du personnel des CAM ;
- Doter des fonds à 8 CAM et deux nouvelles structures fédératives ;
- Négocier des fonds "avance sur campagne" auprès de 04 opérateurs partenaires et auprès de 02 banques (BNI-CA, BOA) ;
- Effectuer des contrôles de gestions externes au niveau des 14 CAM opérationnels ;
- Entretien 107 km de pistes.

COMPOSANTE 2 - APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE

- Appuyer l'élaboration/réactualisation de 34 PDF ;
- Appuyer l'élaboration/réactualisation de 24 PCD (Plan Communal de développement) ;
- Poursuivre la mise en place de 34 dispositifs d'Animateurs relais et procéder à leur évaluation ;
- Mettre à niveau les 49 Agents de terrain sur la méthodologie du PPRR (Conseillers en socio organisation, Agent des guichets fonciers et animateurs en alphabétisation).
- Recycler les 15 Socio organisateurs en Gouvernance locale et décentralisation, développement organisationnel, technique d'animation et de communication rurale, démarche d'approche participative et technique d'appui aux OP ;
- Former les 15 Socio- organisateurs sur les thèmes de montage de projets; membership et leadership, développement de personnalité et plan de carrière, système PER (planification, Evaluation et Rapportage), gestion de base de données et cartographie ;
- Former (Recyclage) les 619 responsables des CDP/CCD, SDV, ADP, OPCI et ARP en Planification, transparence de gestion, de suivi et d'évaluation des réalisations des activités ;
- Redynamiser les 16 guichets fonciers mis en place ;
- Appuyer le fonctionnement de la cellule régionale du Programme Nationale Foncier (PNF) d'Analanjirifo et des 3 C.R.I.F. (Analanjirifo, Toamasina II et Brickaville) ;
- Construire six (06) infrastructures socio collectives (Pôles : Boraha, Onibe, Ivondro, Rongaronga, Rianila et Iaroka) ;
- Former sur les bases fonctionnelles et opérationnelles les structures chargées de la Gestion, entretien et protection des infrastructures ;
- Appuyer et former sur les bases opérationnelles et fonctionnelles, les membres du réseau des femmes rurales entrepreneurs ;
- Recruter et former 92 alphabétiseurs villageois ;
- Réaliser la campagne d'alphabétisation de 4600 adultes ;
- Réaliser des travaux d'aménagement de 2155 ha des périmètres aménagés ;
- Mettre en place 120 parcelles de démonstrations ;

COMPOSANTE 3 – APPUI AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX

- Construire 20 GCV et 29 magasins de stockage ;

- Construire 05 points de services ;
- Doter 4 Points de services en fonds d'équilibre ;
- Réaliser des séances de formation des agents de crédit de l'OTIV ;
- Rendre opérationnelle 110 caisses mixtes.

COMPOSANTE 4 - APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME

- Faire des émissions dans divers stations radiophoniques ;
- Auditer les comptes de l'UGP ;
- Relancer les demandes d'augmentation de dépôts initiaux FIDA ;

COMPOSANTE 5 - APPUI A LA RESILIENCE AUX CRISES ALIMENTAIRES A MADAGASCAR (PARECAM)

- Produire 300 tonnes de semences ;
- Acquérir et distribuer 1425 kg/l d'intrants ;
- Produire 600 tonnes de composts ;
- Mettre en place 30 champs école.

Exécution réalisée pendant le semestre écoulé

COMPOSANTE 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX

- 139 kg de piments séchés rouges, 721 kg de piments verts frais et 194 kg de piments rouges frais **collectés** dans les CAM Maningory et Ranomena et à travers certains groupements. 117 kg de piments séchés rouges, 715 kg de piments verts frais et 56 kg de piments rouges frais **vendues** à des privés tel que Madame Suzanne de Toamasina ;
- 138 kg de miel **collectés** et 74 kg **vendues** dans le CAM Maningory pendant le 1er semestre 2010 (Opérateurs acheteurs : Société Atsinanana de Fénérive - Est, Idéal de Toamasina, Escal Food de Toamasina, Société Wu Chao Ying de Toamasina et des acheteurs individuels) ;
- 251 tonnes de paddy **collectés** dans 14 pôles pendant le premier semestre 2010 (le CAM de Boraha ou Sainte Marie n'est pas opérationnel) et 6,78 tonnes de paddy **vendues** (la vente d'une grande partie de collecte se fera à partir du mois de septembre 2010);
- 39 kg d'huiles essentielles **collectées** et 148 kg **vendues** localement, au niveau des boutiquiers ;
- 801 kg de girofles **vendus** localement ;
- 401 tonnes de maïs **collectés** et 352 tonnes **vendues** à la société L.F.L. ;
- 4,3 tonnes d'ananas **collectés** et 4,3 tonnes d'ananas **vendus** localement et à travers le marché de Bazar Kely de Toamasina ;
- 89 999 USD de chiffres d'affaires pour tous les CAM pour le 1^{er} semestre 2010 ;
- 117 membres du personnel des CAM formés ou ayant effectués des visites échanges dont 34 femmes ;
- 3 bâtiments de CAM (Pôle Ivoloïna, Ivondro et Rongaronga) construits et 4 en cours d'exécution (Pôle Onibe, Izafo Nord, Rianila et Iaroka) ;
- 14 CAM dotés de fonds à travers les deux structures fédératives regroupant les CAM de la zone Nord d'une part et les CAM de la zone Sud d'autre part ;
- 1 contrôle de gestion externe effectuée au niveau des 14 CAM opérationnels ;
- 8 km de pistes rurales entretenues.

COMPOSANTE 2 - APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE

- 38 PDF élaborés/réactualisés ;
- 19 PCD (Plan Communal de développement) mis à jour ;
- 37 Animateurs Relais paysans identifiés (168 ARP et 19 ADP formés dans les 15 pôles dont 93 ARP/ADP sont bénéficiaires de transfert de compétences dans les anciens pôles) ;
- 42 Agents de terrain remis à niveau sur la méthodologie du PPRR (Conseillers en socio organisation,

- Agent des guichets fonciers et animateurs en alphabétisation) dont 16 femmes ;
- 15 Socio organisateurs recyclés en Gouvernance locale et décentralisation, développement organisationnel, technique d'animation et de communication rurale, démarche d'approche participative et technique d'appui aux OP à travers 2 ateliers ;
 - 1682 responsables des CDP/CCD, SDV, ADP, OPCI et ARP formés et/ou recyclés en Planification, transparence de gestion, de suivi et d'évaluation des réalisations des activités ;
 - 19 guichets fonciers, mis en place, redynamisés dont 16 opérationnels ;
 - La cellule régionale du Programme Nationale Foncier (PNF) d'Analanjirifo et le C.R.I.F. (Centre des Ressources et d'information Foncière) Analanjirifo appuyés ;
 - Deux (02) infrastructures socio collectives (E.P.P. Manakambahiny pour le Pôle Iazafo Nord et C.E.G. pour le pôle Manantsatrana) construites ;
 - 152 personnes formées sur les bases fonctionnelles et opérationnelles les structures chargées de la Gestion, entretien et protection des infrastructures, dont 38 des femmes ;
 - 273 femmes, membres du réseau des femmes rurales entrepreneurs appuyées et formées sur les bases opérationnelles et fonctionnelles (15 pôles et 18 réseaux sont touchés) ;
 - 123 Alphabétiseurs villageois recrutés, formés et opérationnels ;
 - 3 777 nouveaux apprenants recensés et 650 en cours de réalisation de formation complémentaire de base (FCB) ;
 - 1 029 ha de périmètres aménagés dont 879 ha du PARECAM et 150 ha de l'OFID ;
 - 157 parcelles de démonstrations dont 96 dans les 6 pôles de la région Atsinanana. Les parcelles de démonstration concernent 12 spéculations (Cultures maraichères, Maïs, Riziculture irriguée, manioc greffé, ananas, site de production intégrée, riziculture pluvial, pisciculture, apiculture, aviculture et porciculture) ;

COMPOSANTE 3 – APPUI AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX

- 28 Greniers Communautaires Villageois (G.C.V.) construits dont 24 des magasins de stockage à multi – usage de 10 tonnes chacun (2 parmi les GCV de 30 tonnes financés par PARECAM) ;
- 04 points de services construits (Pôles Iazafo Nord, Ivondro, Rongaronga et Iaroka) ;
- 61 personne/séance de formation pour les agents de crédit de l'OTIV, sur les Microprojets et l'organisation de la collecte de paddy pour la première campagne de l'année 2010 ;
- 99 caisses mixtes comprenant 1430 membres avec 83 764 USD de crédits octroyés et 739 femmes bénéficiaires de crédit pour le volet octroi de crédits aux plus vulnérables.

COMPOSANTE 4 - APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME

- Relance des demandes d'augmentation de dépôts initiaux FIDA effectuées ;
- 93 articles et émissions audiovisuelles parus sur le PPRR, à travers des séquences de films, des émissions et diverses interventions ponctuelles des représentants du PPRR dans les médias nationaux et locaux ;
- Comptes de l'UGP audités ;

COMPOSANTE 5 - APPUI A LA RESILIENCE AUX CRISES ALIMENTAIRES A MADAGASCAR (PARECAM)

- 64,65 tonnes de semences produites, dont 16 tonnes de riz pluvial, 19,75 tonnes de riz irrigué et 28,9 tonnes de maïs ;
- 1320 kg/l d'intrants acquis dont 670 kg/l distribués, comprenant 600 kg de fongicide et 70 litres de pesticides foliaires ;
- 344 tonnes de composts produites suite à la formation des paysans, dont 172 paysans formés ont adopté la technique. La production moyenne par paysan est estimée à 2 tonnes ;
- 8 champs école mis en place ;

Il a été constaté que l'intervention de l'ODDIT a permis de dégager plus de résultats dans la zone sud du PPRR. A cause du climat, une partie des semences prévues être distribuée pendant la première saison a été inutilisable au moment du semis (août 2010). Des vols d'intrants agricoles stockés au niveau des pôles ont été signalés. L'affaire est en cours de traitement au niveau des autorités compétentes.

Note par rapport à la situation financière du Programme :

Situation par rapport au PTBA au 30 Juin 2010 : Taux de réalisation pour tout financement confondu : 21,9 %, dont OPEP : 10,7 %, FIDA : 44,7 %, Gouvernement : 8,5 %.

Composante 1 : Un taux de 11,8%

Composante 2 : Un taux de 34,8 % ;

Composante 3 : Un taux de 47,8 % ;

Composante 4 : Un taux de 29,9 %.

Le taux de décaissement est faible par rapport au montant total notamment au niveau de la composante 1 sur laquelle l'OFID participe à 45% du budget prévu pour l'année. La prévision du budget OFID tient compte de la date de clôture du Prêt au 31 décembre 2010 alors que la longueur de la procédure de passation des marchés ne permet pas cette prévision. Ainsi, suivant la recommandation de la mission de supervision en juin 2010, le Programme est actuellement en cours de préparation de la demande de prorogation de la date limite de décaissement suivant la date d'achèvement du programme, soit en date du 31 décembre 2012. Le budget 2010 sera donc mis à jour au cours du mois de juillet 2010. Le budget prévu pour le financement OFID sera révisé à la baisse en tenant compte de cette proposition de date de clôture.

Pour FIDA, le rythme de décaissement depuis le dernier semestre 2009 est toujours maintenu jusqu'au 30 juin 2010. En général, ce financement présente un taux de décaissement avoisinant la moitié du budget prévu. Particulièrement, la catégorie équipement est décaissée à 89% après l'acquisition des motos pour les conseillers agricoles du PPRR. Pour la catégorie fonctionnement, le taux de 30% s'explique par la politique de réduction du coût de fonctionnement, appliquée par le programme et surtout le non paiement des dépenses relatives au marché de fournitures de bureau et informatique au cours du premier semestre 2010.

Et enfin, pour le Gouvernement Malagasy, la crise a entraîné beaucoup de difficultés. Le programme connaît de problèmes lors des paiements notamment les taxes qui constituent 81% du montant de la contribution du Gouvernement Malagasy pour l'année 2010. La grande partie des engagements du premier trimestre restent toujours en instance au 30 juin 2010. Concernant les ressources propres internes (RPI), le versement dans le compte du programme a été effectué le 16 juin pour le premier trimestre 2010 après l'intervention du directeur administratif et financier du Ministère de l'Agriculture.

Par rapport au financement total du Programme au 30 Juin 2010: 46,7 % du montant total du financement du Programme dont FIDA : 58,6 %, OPEP : 41,4 %, Gouvernement : 20,9 %.

Les dépenses en génie civil financées à 64% par les fonds OPEP, le reste ayant été financé par le FIDA, le GDM et les bénéficiaires. D'une manière générale, dans toutes les catégories de dépenses, le FIDA est le principal financeur. L'OPEP a participé à hauteur de 11% dans la catégorie "Formation, Etudes et assistance technique". Le GDM a participé d'une manière significative dans les catégories "génie civil", "équipements et moyens de transport" et "coûts de fonctionnement". Le budget de la catégorie "Equipement" a été réalisé à hauteur de 80,1%, vient ensuite la catégorie "coûts de fonctionnement" avec 76,0%, et la catégorie "Formation, études et assistance technique" avec 70,4% de réalisation. Rien n'a été dépensé du budget "non alloué". Par rapport au cumul décaissé, 68% provient du FIDA, 22% de l'OPEP, 7% du GDM, 2% des bénéficiaires et 1% des opérateurs.

Situation financière du PARECAM :

Situation au 30 Juin 2010 par rapport à l'enveloppe global du PARECAM y compris l'additif : 1 278 269 Euro, un taux de réalisation de 76,4%.

Résultat 1 : 96,4% ; Résultat 2 : 77,4% ; Résultat 3 : 46,8% et Résultat 4 : 57,1%.

B. Réalisation des objectifs de développement

Objectifs de développement du projet

L'objectif de développement est la réduction de la pauvreté rurale dans les régions d'Analanjirofo et d'Atsinanana par l'accroissement des revenus ruraux et l'amélioration de la capacité des communautés de base à prendre en charge leurs projets de développement.

L'objectif général du programme est l'accroissement et la sécurisation durable des revenus des petits producteurs dans la zone ainsi que des disponibilités alimentaires et nutritionnelles.

Les objectifs spécifiques sont :

- i. ***L'amélioration de l'accès des producteurs au marché et de la valorisation des produits, à travers :***
 - a. La rationalisation des systèmes de collecte : Amélioration de la qualité des produits proposés sur les filières développés jusqu'ici (miel, piment, huiles essentielles, riz, ananas et litchis) bien palpable. L'appui à la filière ananas entamé depuis l'année 2009, a permis la production de plus de 5 tonnes d'ananas et une vente de 4,3 tonnes, pendant le 1^{er} semestre 2010. La recherche de débouchés dans la filière litchis et l'amélioration des collaborations avec les partenaires commence à porter ses fruits.
4 grands produits (litchis, paddy, maïs et grenadelle) sont organisés en opérations à partir de cette année, dans le but d'améliorer la coordination de chaque filière.
 - b. Le renforcement de la position de négociation des petits producteurs : les regroupements des paysans producteurs à travers les fédérations continuent : 14 Unions gestionnaires des CAM ayant comme statut des coopératives, 44 unions de filières et 7 fédérations sont fonctionnelles et opérationnelles pendant le 1^{er} semestre 2010. A travers les 4 grandes opérations que le Programme appuie actuellement, plusieurs grands opérateurs, ont montré leurs bonnes volontés à collaborer étroitement. Des protocoles de collaborations ont été signés et les étapes de préparation des prochaines campagnes sont déjà préparées ensemble. Entre autres, il y a le L.F.L., pour le maïs, le Groupement des Exportateurs de Litchis (GEL) pour les litchis primeurs, la société Faly Export pour la grenadelle.
 - c. L'amélioration de la qualité des produits et la valorisation par la transformation : Les mises en bocaux et les étiquetages. Le suivis des normes en ce qui concerne les traitements des miels, avant leur vente dans les grandes surfaces valorisent les produits des paysans et donnent des plus values au CAM qui s'en occupe.
 - d. Le développement de partenariats entre producteurs groupés et opérateurs commerciaux, notamment pour l'accroissement de la valeur ajoutée au stade producteur et l'introduction de nouveaux produits ou labels :
Le partenariat avec la société L.F.L. dans le cadre de la commercialisation de maïs a été une réussite. Les producteurs regroupés dans les deux fédérations ont pu respecter leurs engagements aussi bien en qualité qu'en quantité. L'opérateur était satisfait de cette collaboration et a qualifié les CAM comme un vrai partenaire.
La poursuite de ce partenariat pourrait s'étendre au préfinancement par le LFL de la collecte de maïs pour la saison prochaine.
 - e. L'amélioration des conditions de transport des produits (désenclavement) : Avec la réhabilitation des pistes et des sentiers, les paysans peuvent facilement sortir leurs productions, ont moins de mal pour transporter leurs productions à dos d'homme. Les prix des produits de première nécessité descendent presque automatiquement dans les zones désenclavées. Le nombre des bicyclettes circulant au niveau des zones désenclavées et le nombre des trafics ne cessent d'augmenter après les travaux de désenclavement.
- ii. ***L'intensification, l'accroissement et la diversification de la base productive, notamment des populations les plus vulnérables, de façon positive pour l'environnement, grâce à :***
 - a. Une amélioration de la gouvernance locale permettant la participation effective des plus vulnérables aux mécanismes de développement : Les OP encadrés par le PPRR ont apporté une participation active dans l'élaboration des plans de développements communautaires. Les vulnérables et les plus démunis sont bien représentés dans ces OP. Le processus participatif adopté pour l'élaboration des plans intègre la vision des pauvres dans la gouvernance en particulier dans la planification du développement. Les OP n'ayant comme membre que les plus vulnérables ont les mêmes droits que les autres et participent au même titre que les


autres dans tous les processus de prise de décision où ils sont représentés. Le nombre d'OP travaillant avec le Programme ne cesse d'augmenter.

- b. Le renforcement des organisations de producteurs : Organisés en coopératives formalisées, les producteurs évoluent dans le formel. L'union au niveau de chaque pôle continue à assurer le rôle d'interlocuteur direct des opérateurs à travers le CAM. Les fédérations au niveau de chaque région et au niveau interrégional assurent ce rôle à leur niveau.
- c. L'amélioration de l'accès au crédit rural : La multiplication par trois du nombre des membres servis par les points de services (11 148), en trois ans de collaboration, prouve les efforts déployés par le Programme dans le secteur, alors qu'ils n'étaient que 3779 à la signature du contrat.
- d. La fourniture d'un conseil agricole de qualité et la fourniture d'appui financier à l'investissement par les producteurs : L'augmentation du nombre des paysans encadrés, par les techniciens du Programme, qui sont actuellement à 11 834 dont 4 098 des femmes, alors que les bénéficiaires des microprojets ne sont que 3 969, démontre l'intérêt que portent les paysans de la zone d'intervention du Programme aux services fournis par les conseillers agricoles. Les demandes de microprojets ne cessent d'augmenter malgré le changement de la procédure qui exigeait l'intégration de l'OTIV dans le financement des microprojets.

PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISEMENT DES PRETS FIDA (621-MG) ET OPEP (970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2010

PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P

Composante/ Sous Composante	Code	PTBA 2010							Décaissement au 30 Juin 2010							Execution en %							
		FIDA	GDM	Beneficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Beneficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Beneficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	
1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX	I							5 165,8							612,0								11,8%
1 - Appui aux unions gestionnaires des CAM	11	349,8	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	409,7	163,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	164,5	46,7%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,1%	
2 - Appui au développement des marchés et des partenariats	12	125,3	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	70,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	56,4%	13,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,4%	
3 - Désenclavement des pôles	13	0,0	347,2	182,5	0,0	3 650,5	12,8	4 192,9	0,0	37,9	0,0	0,0	335,3	0,0	373,3	0,0%	10,9%	0,0%	0,0%	9,2%	0,0%	8,9%	
4 - Fonds post-cyclonique	14	35,7	68,9	0,0	0,0	308,6	0,0	413,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE	II							2 345,0							815,3							34,8%	
21 - Appui à la gouvernance locale et à l'Organisation Paysanne	21	210,2	51,4	0,0	0,0	272,8	0,0	534,4	114,0	5,5	0,0	0,0	21,1	0,0	140,6	54,2%	10,7%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	26,3%	
22 - Appui aux producteurs et micro-projets	22	687,5	108,6	63,2	34,6	816,6	0,0	1 710,5	301,5	14,1	116,0	41,1	184,5	0,0	657,2	43,9%	13,0%	183,6%	118,6%	22,6%	0,0%	38,4%	
23 - Recherche et développement	23	54,3	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,1	17,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	31,7%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,4%	
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS	III							630,0							301,1							47,8%	
31 - Accessibilité aux services financiers de proximité	31	527,1	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	607,3	281,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,7	53,4%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	46,9%	
32 - Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	32	20,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	16,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	78,1%	11,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	72,5%	
4. APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME	IV							658,6							196,7							29,9%	
41 - Gestion du programme UGP	41	544,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	632,3	185,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1	34,0%	10,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,7%	
42 - Suivi Evaluation	42	23,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	10,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,9%	
TOTAL		2 578,6	879,2	245,7	34,6	5 048,5	12,8	8 799,4	1 152,2	74,8	116,0	41,1	540,9	0,0	1 925,0	44,7%	8,5%	47,2%	118,6%	10,7%	0,0%	21,9%	

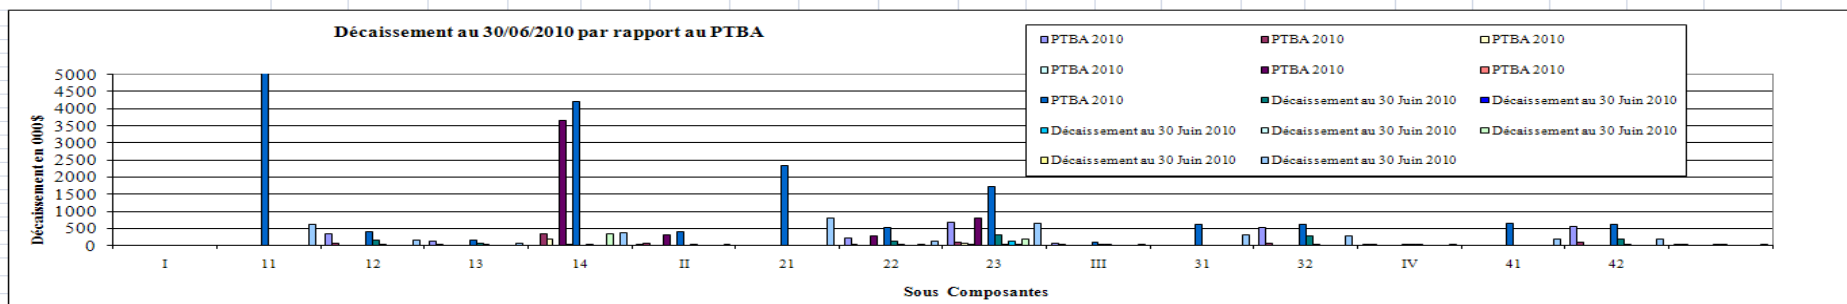

CUMUL PAR COMPOSANTE (COUT TOTAL)


PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA (621-MG) ET OFID (970-P) (000 USD)
 Situation au 30 Juin 2010

PAYS : MADAGASCAR

PRETS FIDA: 621-MG

PRETS OFID: 970-P

Composante	Code	Plan de Financement total du Programme							Décaissement cumulé au 30 Juin 2010							Exécution en %						
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total
Appui aux développements des pôles et aux partenariats commerciaux	I	2 737,0	2 950,4	150,6	120,3	5 497,0	115,7	11 571,1	1 542,7	401,6	46,7	10,6	2 125,9	0,0	4 127,4	56,4%	13,6%	31,0%	8,8%	38,7%	0,0%	35,7%
Appui à la structuration du monde rurale et à l'amélioration de la base productive	II	6 098,6	1 001,8	791,1	112,9	1 183,6	0,0	9 188,1	2 593,6	149,5	206,0	68,0	727,6	0,0	3 744,7	42,5%	14,9%	26,0%	60,2%	61,5%	0,0%	40,8%
Appui aux services financiers	III	1 736,0	366,2	0,0	0,0	212,5	0,0	2 314,6	1 351,8	105,5	11,4	0,0	0,0	0,0	1 468,7	77,9%	28,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,5%
Appui à la gestion du Programme	IV	4 907,5	401,4	0,0	0,0	6,1	0,0	5 315,0	3 575,6	332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 907,7	72,9%	82,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	73,5%
TOTAL		15 479,1	4 719,8	941,8	233,2	6 899,2	115,7	28 388,9	9 063,7	988,6	264,1	78,5	2 853,5	0,0	13 248,4	58,6%	20,9%	28,0%	33,7%	41,4%	0,0%	46,7%

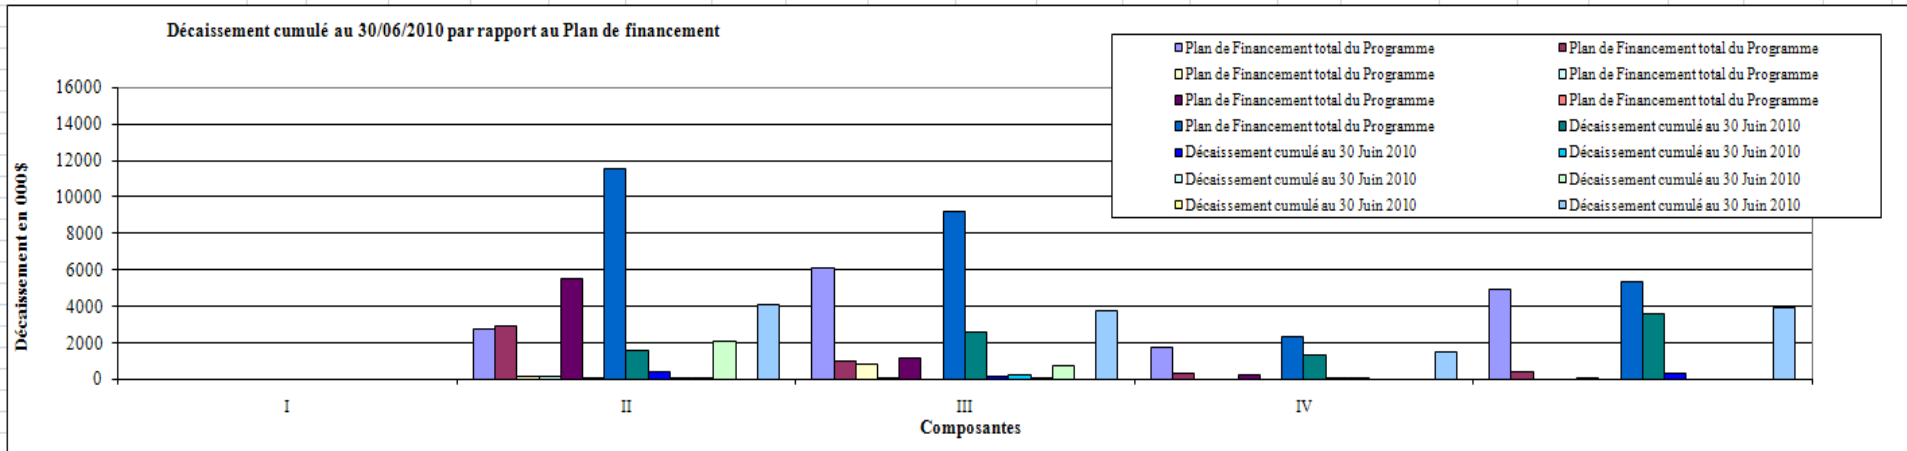


DECAISSEMENT PAR CATEGORIE (% DU PTBA)

PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA (621-MG) ET OPEP (970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2010

PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P

Catégorie	Code	PTBA 2010							Decaissement au 30 Juin 2010							Execution en %							
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	
Genie civil	XII							5 529,5							889,8								16,1%
Amenagement hydroagricoles	XIIa	0,0	33,5	0,0	0,0	770,4	0,0	803,9	0,0	0,0	87,9	0,0	150,9	0,0	238,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,6%	0,0%	29,7%	
Routes et pistes	XIIb	0,0	324,1	172,7	0,0	3 379,1	12,8	3 888,6	0,0	36,2	0,0	0,0	286,0	0,0	322,2	0,0%	11,2%	0,0%	0,0%	8,5%	0,0%	8,3%	
Autres infrastructures	XIIc	473,7	105,9	0,0	0,0	257,4	0,0	837,0	300,1	10,2	0,0	0,0	18,5	0,0	328,8	63,4%	9,6%	0,0%	0,0%	7,2%	0,0%	39,3%	
Equipement et Moyens de transport	XIII	63,3	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	56,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	89,7%	6,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,9%	
Formation, études et assistance technique	XIV	668,5	116,9	9,9	0,0	333,0	0,0	1 128,2	313,7	4,4	0,0	0,0	85,5	0,0	403,7	46,9%	3,8%	0,0%	0,0%	25,7%	0,0%	35,8%	
Prestataires de services	XV	475,5	136,5	0,0	0,0	22,7	0,0	634,7	209,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	221,6	43,9%	9,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	34,9%	
Fonds d'appui et micro projets	XVI	632,7	64,3	63,2	34,6	285,9	0,0	1 080,8	189,3	0,1	28,1	41,1	0,0	0,0	258,6	29,9%	0,2%	44,5%	118,6%	0,0%	0,0%	23,9%	
Salaires et indemnités	XVII	116,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	34,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	32,8%	
Cout de Fonctionnement	XVIII	148,8	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	43,9	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	29,5%	12,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,6%	
TOTAL		2 578,6	879,2	245,7	34,6	5 048,5	12,8	8 799,4	1 152,2	74,8	116,0	41,1	540,9	0,0	1 925,0	44,7%	8,5%	47,2%	118,6%	10,7%	0,0%	21,9%	

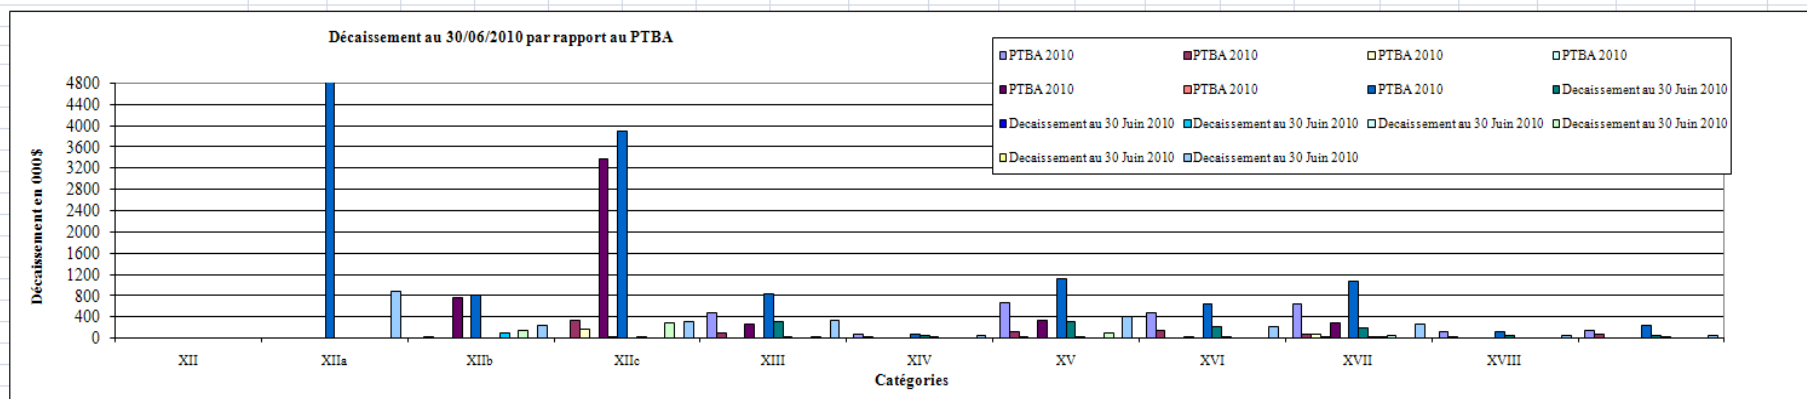

DECAISSEMENT PAR CATEGORIE (% DU COUT TOTAL)

PPRR

PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX

DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OFID (970-P) (000 USD)

Situation au 30 Juin 2010


PAYS : MADAGASCAR

PRETS FIDA: 621-MG

PRETS OFID: 970-P

Catégorie	Code	Plan de Financement total du Programme							Décaissement cumulé au 30 Juin 2010							Exécution en %							
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	
Genie civil	XII							10 475,8							3 663,5								35,0%
Amenagement hydroagricoles	XIIa	0,0	260,6	120,9	0,0	719,7	0,0	1 101,2	0,0	31,2	87,9	0,0	311,1	0,0	430,2	0,0%	12,0%	72,7%	0,0%	43,2%	0,0%	39,1%	
Routes et pistes	XIIb	0,0	2 442,0	135,3	0,0	4 797,1	115,7	7 490,1	0,0	296,1	25,7	0,0	1 745,0	0,0	2 066,8	0,0%	12,1%	19,0%	0,0%	36,4%	0,0%	27,6%	
Autres infrastructures	XIIc	762,5	477,9	31,3	0,0	612,8	0,0	1 884,4	727,0	99,9	48,4	0,0	291,2	0,0	1 166,4	95,3%	20,9%	154,6%	0,0%	47,5%	0,0%	61,9%	
Équipement et Moyens de transport	XIII	854,0	199,7	0,0	24,5	10,7	0,0	1 088,9	732,3	129,4	0,0	0,0	10,7	0,0	872,5	85,7%	64,8%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	80,1%	
Formation, études et assistance technique	XIV	4 803,9	338,8	5,8	10,6	414,6	0,0	5 573,7	3 381,8	100,6	0,0	10,6	428,4	0,0	3 921,5	70,4%	29,7%	0,0%	100,0%	103,3%	0,0%	70,4%	
Prestataires de services	XV	3 263,6	739,8	71,1	85,2	87,2	0,0	4 246,8	1 785,4	105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 890,7	54,7%	14,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	44,5%	
Fonds d'appui et micro projets	XVI	3 294,1	15,9	577,4	112,9	257,2	0,0	4 257,5	1 256,2	31,9	102,2	68,0	66,9	0,0	1 525,2	38,1%	200,5%	17,7%	60,2%	26,0%	0,0%	35,8%	
Salaires et indemnités	XVII	686,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	686,3	412,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	412,9	60,1%	1098,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,2%	
Coût de Fonctionnement	XVIII	1 021,8	245,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 266,8	768,8	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	962,3	75,2%	78,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	76,0%	
Non alloué	XI	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
TOTAL		15 479,1	4 719,8	941,8	233,2	6 899,2	115,7	28 388,9	9 063,74	988,6	264,1	78,5	2 853,5	0,0	13 248,4	58,6%	20,9%	28,0%	33,7%	41,4%	0,0%	46,7%	

Décaissement cumulé au 30/06/2010 par rapport au Plan de financement

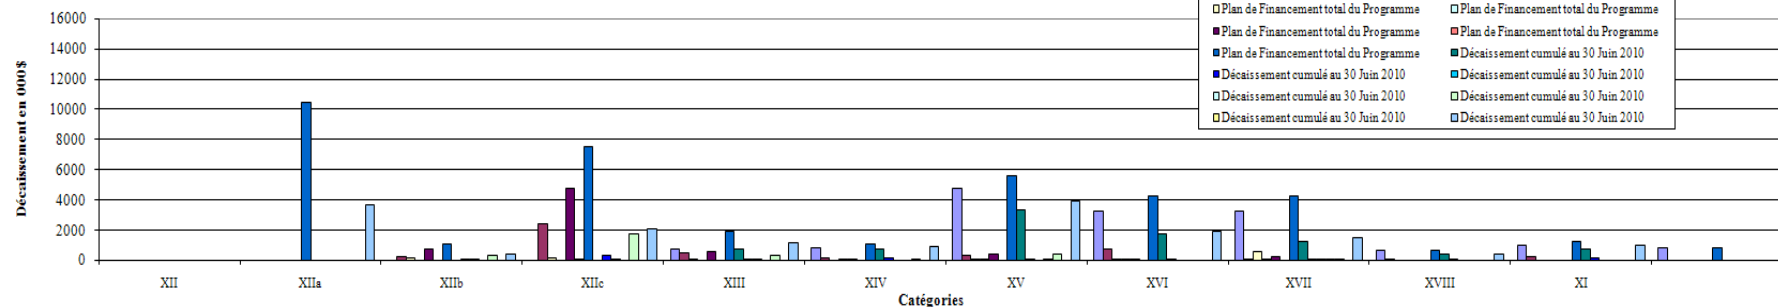

C.6. CADRE LOGIQUE DU PPRR

Objectifs/résultats/activité	Indicateurs	Source de vérification	Conditions critiques
<p>Objectif de développement: Réduction de la pauvreté rurale par l'accroissement des revenus et l'amélioration des communautés de base à prendre en charge leur développement dans les régions d'Analanjirifo et Atsinanana</p>	<p>Pourcentage de la population qui se sent en difficulté par rapport à leur propre niveau de vie. Pourcentage de ménages obligés de puiser dans leurs épargnes ou de s'endetter pour satisfaire à leurs besoins</p>	<p>Enquêtes régionales de pauvreté Enquêtes de revenus</p>	<p>Stabilité politique et environnement des affaires favorable Absence de catastrophe naturelle exceptionnelle</p>
<p>Objectif général du programme: Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs (grâce à un meilleur accès aux marchés) et amélioration de la base productive (sécurisation alimentaire et nutritionnelle)</p>	<p>Augmentation en % du revenu moyen des ménages ruraux de la zone d'intervention du Programme Taux de prévalence de la malnutrition infantile (garçons/filles) Personnes ayant bénéficié des services du projet</p>	<p>Enquêtes suivi évaluation Idem Enquêtes suivi évaluation</p>	<p>Évolution non défavorable des cours des principaux produits exportés Absence de catastrophe naturelle exceptionnelle</p>
<p>Objectifs spécifiques 1- Amélioration de l'accès des producteurs aux marchés et de la valorisation des produits (<i>composante 1</i>), à travers :</p> <p>(a) la rationalisation des systèmes de collecte</p> <p>(b) le renforcement de la position de négociation des petits producteurs</p> <p>(c) l'amélioration de la qualité des produits et de développement de la transformation</p> <p>(d) le développement de partenariats durables entre producteurs groupés et opérateurs commerciaux</p>	<p>Pourcentage d'augmentation du volume de vente au sein des CAM. Evolution du nombre de spéculations vendues Nombre de contrats conclus entre opérateurs et groupements. Nombre d'actions de plaidoyer (commercial) effectués par les groupements Evolution de produits vendues, par spéculation [(Piments, Paddy, Girofle, Huiles essentielles, Miel et Litchis) - (marchés à l'exportation et marchés locaux et nationaux)] Volume de produits vendus à travers des contrats directs avec les opérateurs (à travers les CAM ou les groupements) Nombre de communes entretenant (participant à l'entretien) le SIM.</p>	<p>Rapports d'activités au niveau des CAM Rapports d'activités (mercuriales) SIM</p>	<p>Volonté des opérateurs commerciaux à adopter des stratégies à long terme</p> <p>Politique nationale favorable au développement du secteur privé</p> <p>Capacité des paysans à adopter des stratégies à long terme</p>

Objectifs/résultats/activité	Indicateurs	Source de vérification	Conditions critiques
(e) l'amélioration des conditions de transport	<p>Taux d'appropriation du SIM (Nb de profils enregistrés)</p> <p>Nombre de produits ayant obtenus un label</p> <p>Volume de produits conditionnés, transformés et labélisés</p> <p>Pourcentage d'évolution des ventes des produits des CAM.</p> <p>Quantités livrées sur les marchés nationaux et locaux</p> <p>Evolution des autres formes de diversification de débouchés</p> <p>Nombre de contrat établi entre groupes de producteurs et opérateurs commerciaux</p> <p>Volume d'affaires réalisées sur contrat direct entre producteurs groupés et opérateurs commerciaux</p> <p>Quantités de produits commercialisés dans le cadre du partenariat</p> <p>Evolution du chiffre d'affaires des CAM</p> <p>Evolution du CA des alambics gérés par les CAM.</p>	<p>Rapport suivi-évaluation</p> <p>Données CAM</p> <p>Sondages et observations directes.</p> <p>Suivi évaluation</p> <p>Rapport CAM Communes PCD</p>	
	(f) l'émergence de nouveaux acteurs	<p>Longueur de pistes rurales réhabilitées,</p> <p>Nombre d'AUP formalisées,</p> <p>Longueur de pistes rurales praticables après remise en état</p> <p>Nombre de micro projet MIT mis en place</p> <p>Longueur additionnelle de voie praticable par des véhicules de transport</p> <p>Evolution du nombre de véhicules dans la zone désenclavée</p> <p>Population des zones de production désenclavées grâce aux réhabilitations de pistes et de sentiers organisées et/ou financées par le PPRR</p>	

Objectifs/résultats/activité	Indicateurs	Source de vérification	Conditions critiques
<p>2- Intensification, accroissement et diversification, durables et positifs pour l'environnement, de la base productive, notamment au profit des populations les plus vulnérables (<i>composante 2</i>), à travers:</p> <p>(a) l'amélioration de la gouvernance locale</p> <p>(b) le renforcement des organisations de producteurs</p> <p>(c) la fourniture d'un conseil agricole de qualité</p> <p>(d) un appui financier à l'investissement par les</p>	<p>Nombre d'OP formalisés (ayant des récépissés)</p> <p>Nombre de Plan de développement élaboré</p> <p>Nombre d'OP effectuant régulièrement leur AG</p> <p>Nombre d'association effectuant des sessions d'auto évaluation.</p> <p>Infrastructures socio-collectives fonctionnelles plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction</p> <p>Proportion de groupes opérationnels/fonctionnels (toutes composantes) plus de 1 an après la constitution</p> <p>Augmentation de la production de 4 spéculations stratégique (Riz, maïs, litchis et grenade).</p> <p>Quantité de production produit par les petits producteurs bénéficiaires du projet collectée au niveau du CAM</p> <p>Rendement moyen du riz irrigué chez les petits producteurs</p> <p>Rendement moyen du riz pluvial chez les petits producteurs</p> <p>Rendement moyen du maïs chez les petits producteurs</p> <p>Surface de terre améliorée par des mesures de préservation des sols et de l'eau</p> <p>Nombre de microprojets viables après 1 an</p>	<p>Suivi évaluation</p> <p>Rapports d'auto-évaluation</p> <p>Rapports d'auto-évaluation</p> <p>Rapport de suivi évaluation</p> <p>Rapport de suivi évaluation</p> <p>Rapport des OA en conseils agricoles</p> <p>Rapport du CRIF et de la cellule régionale foncière</p>	<p>Disposition du GdM à procéder à des dotations foncières</p>

Objectifs/résultats/activité	Indicateurs	Source de vérification	Conditions critiques
producteurs (e) la sécurisation foncière	d'activité Nombre de ménages effectuant une demande de certificats fonciers auprès des guichets fonciers Nombre de certificats fonciers délivrés		
3- L'accessibilité pérenne à des services financiers à travers: (a) Un accès aux services financiers (b) une gamme variée de services d'épargne et de crédit (c) le financement d'activités productives agricoles (d) l'élimination des contraintes à l'offre de services financiers.	Nombre de points de services opérationnels Evolution du volume crédit contracté dans les points de services travaillant avec le Programme Evolution du volume de crédits pour des nouveaux produits spécifiques. Taux de recouvrement des paysans auprès des IMF Volume de crédits aux plus vulnérables Taux de recouvrement des crédits Autonomie opérationnelle des points de services Augmentation du nombre de ménages effectuant un emprunt auprès des IMF. Taux de pénétration des IMF (caisses OTIV) Taux de pénétration des caisses mixtes (groupes solidaires pour le crédit aux vulnérables) Encours total de crédits agricoles	Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF Rapports financiers et statistiques des IMF	Potentialité des sites choisis pour la microfinance Solidarité dans le réseau des IMF
Composante 1: Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux <i>Résultat 1: Existence de CAM/pôles de développement viables et améliorant l'accès des producteurs au marché</i>	Nombre de CAM/pôles de développement créés	Enquête opinion des	Volonté de

Objectifs/résultats/activité	Indicateurs	Source de vérification	Conditions critiques
<ul style="list-style-type: none"> • La qualité des produits est améliorée • Les prix de vente du paddy à la récolte sont améliorés et le prix d'acquisition en soudure réduits • Les unions locales de producteurs gestionnaires des CAM fonctionnent en tant qu'agents économiques viables et compétitifs • Les conditions de transports sont améliorées (vers le CAM/pôle et entre le CAM/pôle et le marché) • Les activités de première transformation en milieu rural sont développées 	<p>Nombre de produits ayant obtenus un label. Evolution du nombre de produits concernés par le commerce international. Rapport prix FOB/cours mondiaux Augmentation exportations Ratio du prix d'achat du riz blanc auprès du producteur par rapport au prix de vente aux consommateurs Ratio du prix d'achat du miel auprès du producteur par rapport au prix de vente aux consommateurs Ratio du prix d'achat du maïs auprès du producteur par rapport au prix de vente aux consommateurs Prix locaux et des coûts d'approvisionnement en paddy et riz des ménages Nombre de CAM opérationnelles plus de un an après le début des activités. Quantités commercialisées Résultats d'exploitation Pourcentage évolution volume opérations au sein des CAM</p> <p>Coût des transports</p> <p>Nombre d'unités de transformation installées et fonctionnelles sous forme de microprojets</p>	<p>opérateurs</p> <p>Enquête Idem</p> <p>Idem</p> <p>Rapport suivi-évaluation</p> <p>Rapports d'activités du programme</p> <p>Rapports de suivi-évaluation idem</p>	<p>développement des producteurs et opérateurs</p> <p>Cohésion des OP, volonté de travailler ensemble et de se professionnaliser Intérêt des opérateurs commerciaux pour des partenariats avec les unions de producteurs</p> <p>Système de contrôle de qualité performant</p>

Objectifs/résultats/activité	Indicateurs	Source de vérification	Conditions critiques
<p><i>Résultat 2: Renforcement des capacités des opérateurs commerciaux et des prestataires de services</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les intervenants sont mieux informés des prix des principaux produits et des opportunités du marché • Des labels de qualité et des partenariats opérateurs commerciaux/producteurs sont développés • De nouveaux créneaux/produits sont identifiés et exploités 	<p>Connaissance des principaux prix sur le marché Nombre de profils enregistrés sur le SIM Nombre de requête de prix relevés au niveau des SIM.</p> <p>CA sous label de qualité CA des opérations en partenariat Nombre de partenariats signés Exportations non traditionnelles des opérateurs partenaires Quantités de produits vendues sur les marchés locaux et nationaux</p>	<p>Union des producteurs</p> <p>CDP</p> <p>Études de marché recherche-développement</p>	<p>Mise en place du SIM</p> <p>Suivi durable assuré du partenariat</p> <p>Intérêt des opérateurs commerciaux pour des partenariats avec les petits producteurs</p>
<p>Composante 2: Appui à la sécurisation, l'intensification et la diversification durables de la production</p> <p><i>Résultat 1: Les capacités opérationnelles et la gouvernance des communes rurales, des fokontany et des OP sont renforcées</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le foncier des populations rurales est sécurisé • Les capacités de contrôle social sont améliorées grâce notamment à l'alphabétisation • Les populations cibles sont organisées en OP opérationnelles 	<p>Nombre de certificats fonciers délivrés par les guichets fonciers.</p> <p>Nombre de ruraux participants aux séances d'alphabétisation alphabétisés</p> <p>Nombre d'OP</p> <p>Niveau de participation des groupes cibles vulnérable dans les OP</p> <p>Nombre d'OP formalisé (récépissé)</p>	<p>Rapport d'activités GF et CRIF, PCD Rapport d'activités ONG partenaires</p> <p>Rapport d'activités ONG partenaires Plan d'action des OP PCD</p> <p>Rapports suivi évaluation</p>	<p>Financement du programme national foncier</p> <p>Nouvelles sources de revenus des CR pour investissement et entretien des infrastructures</p> <p>Capacité des IMF partenaires à satisfaire</p>

Objectifs/résultats/activité	Indicateurs	Source de vérification	Conditions critiques
<ul style="list-style-type: none"> L'entretien courant des infrastructures sont assurée par les collectivités locales <p><i>Résultat 2: Les revenus des producteurs sont sécurisés, diversifiés et accrus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Les activités et les cultures sont diversifiées et leur rendement a augmenté Les contraintes foncières et techniques limitant l'accès des petits producteurs aux exploitations agricoles et à leur développement sont réduites Le capital productif est entretenu et renouvelé 	<p>Qualité de l'entretien Montant du budget des CR affecté à l'entretien Composition du revenu moyen des populations cibles</p> <p>Sensibilité de ce revenu aux variations des cours mondiaux Nombre de microprojets financés et viables après 1 an d'exploitation Superficies concernées par les techniques améliorées. Superficies plantées par population cible Nombre de plants distribués Nombre de site de production mis en place</p> <p>Superficie réhabilitée, par spéculation</p>	<p>Enquête suivi évaluation Idem</p> <p>Rapport d'activités des conseillers agricoles</p> <p>Idem Idem Statistiques agricoles Enquêtes nutritionnelles Suivi évaluation</p>	<p>les besoins financiers des populations cibles Stabilité relative des cours mondiaux</p> <p>Contrôle de l'insécurité</p>
<p><i>Résultat 3: La sécurité alimentaire et nutritionnelle est améliorée</i></p> <ul style="list-style-type: none"> La productivité du paddy est accrue grâce au SRI/SRA et une meilleure maîtrise de l'eau Les aliments disponibles sont plus variés Les besoins alimentaires des ménages bénéficiaires sont mieux assurés 	<p>Rendement moyen en riz/ha Volume de production</p> <p>Nombre de parcelle et spéculation par ménage</p>		

Objectifs/résultats/activité	Indicateurs	Source de vérification	Conditions critiques
<p>Composante 3. Appui aux services financiers Résultat 1: <i>L'accessibilité pérenne à des services financiers offrant une gamme variée de services d'épargne et de crédit permettant la mise en place d'activités productives agricoles et non agricoles</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'offre de produits d'épargne et de crédit répondant aux besoins des groupes cibles et de leurs organisations est variée ▪ L'accès à des crédits pour les populations les plus vulnérables est facilité ▪ La capacité des groupes cibles à formuler des demandes et de gérer des crédits est renforcée ▪ Les risques de crédit des points de services sont réduits ▪ Les capacités des points de services sont renforcées ▪ L'efficacité des points de services est améliorée ▪ L'environnement du secteur de la microfinance est amélioré 	<p>Nombre de demande de crédit, Volume de crédit, Taux de recouvrement Nombre et volume de crédits accordés Volume d'épargne collectée Nombre de membres dans les points de services Type de crédit accordé</p> <p>Volume de crédit aux plus vulnérables Nombre de caisses 'mixtes'</p> <p>Taux de rejet des demandes de crédit formulées auprès des points de services Nombre de microprojets viables après 3 ans CA et résultat consolidés pour les microprojets</p> <p>Taux d'impayé et PAR à 30 et 90 jours</p> <p>Nombre de formation/participants</p> <p>Équilibre financier des points de services</p> <p>Nombre de formation et documents méthodologiques partagés</p>	<p>Statistiques des IMF Le suivi par échantillon de crédits</p> <p>Plan d'action de l'APIFM</p>	<p>Risque externe de crédit (climat, prix)</p> <p>Risque interne (comportement des bénéficiaires, maîtrise du crédit par les IMF) Monétarisation grâce au développement socio-économique du monde rural</p> <p>Politique nationale en matière de micro finance</p>

C. Annexes

Nota : les annexes financières sont les mêmes que celles utilisées dans les rapports de supervision.

C.1 Tableau de financement total du projet par catégories de déboursement du projet et par bailleur

(ref. fichier Excel)

C.2 Tableau de financement par composante, sous composante et par an, prévu et réalisé

(ref. fichier Excel)

C.3 Tableau de synthèse des indicateurs choisis pour le suivi des réalisations physiques par composante et sous composante

(ref. fichier Excel)

C.4 Tableau et graphe des réalisations physiques par composante pondérées par leurs réalisations financières respectives

(ref. fichier Excel)

C.5 Tableau des indicateurs choisis pour suivre la réalisation des objectifs de développement

(ref. fichier Excel)

C.6 Cadre logique complet du projet avec les indicateurs de suivi choisis

(réf. [Fichier](#) Word)
