



SEGS II-Analyse RIMS – Projet PPRR

Les indicateurs RIMS du FIDA servent à mesurer et à présenter la performance des projets financés par le Fonds. Ils sont utiles à divers niveaux: i) le FIDA peut agréger les résultats obtenus tant au niveau des activités, des résultats que de l'impact pour l'ensemble des projets; ii) les RIMS servent également d'outil de suivi et d'aide à la décision tant à l'échelle de la division, du portefeuille de pays que du projet.

Les indicateurs RIMS standards du FIDA sont à l'heure actuelle composés de:

- 65 indicateurs de premier niveau, mesurant les activités du projet
- 43 indicateurs et 22 indicateurs « qualitatifs » (sous forme de barèmes allant de 1 à 6) de deuxième niveau, dédiés aux résultats; et
- 13 indicateurs de troisième niveau relatifs à l'impact.

Ces indicateurs sont répartis en 9 catégories:


1. Ressources naturelles (terre et eau)
2. Production et techniques agricoles
3. Services financiers ruraux
4. Marchés
5. Création d'entreprises et d'emplois en milieu rural
6. Elaboration de politiques et développement des communautés
7. Infrastructure sociale
8. Nombre de bénéficiaires
9. Impact

En début de projet, la cellule Suivi-Evaluation est en charge de choisir un mix d'indicateurs qui rendra le plus compte des activités du projet. Ainsi, s'il s'agit d'un projet de microfinance, on ira choisir les indicateurs au sein de la catégorie « services financiers ruraux », ou s'il s'agit d'un projet de soutien aux microentreprises, on se référera à « Création d'entreprises et d'emplois en milieu rural », etc.

Une analyse des données RIMS envoyées annuellement au FIDA par les projets a été réalisée sur l'ensemble des données soumises entre 2005 et 2010.

Un set d'indicateurs a été retenu pour mener l'analyse au niveau de chaque composante à savoir: i) l'appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux, ii) l'appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive, iii) l'appui aux services financiers et enfin iv) l'appui à la gestion du programme. En voici les principaux résultats.


Installations de commercialisation, de transformation et de stockage (RIMS 1 et 2)

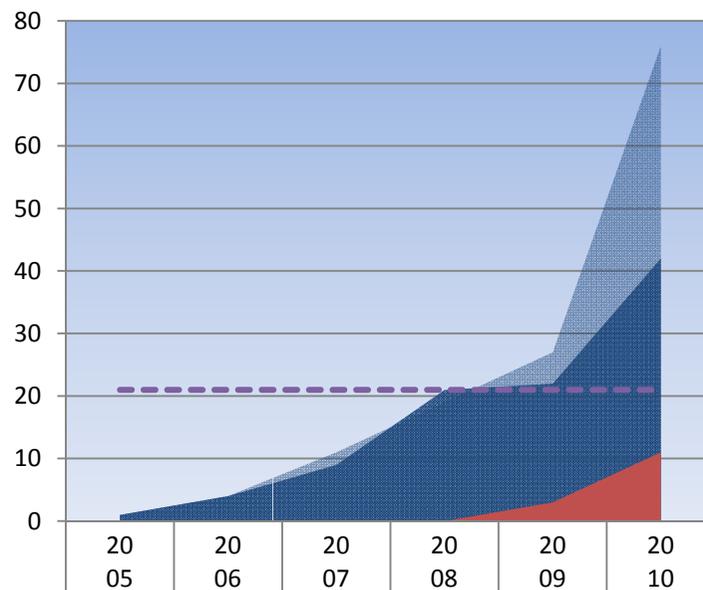

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Installations de commercialisation, transformation et de stockage construits/remis en état prévu	1	4	11	19	27	76
Installations de commercialisation, transformation et de stockage construits/remis en état réalisé	1	4	9	21	22	42
Installations de commercialisation, transformation et de stockage en service au bout de 3 ans					3	11
Objectif	21	21	21	21	21	21

Les installations de commercialisation, de transformation et de stockage qui ont été construites ou remises en état sont au nombre de 42 à la fin 2010. Pourtant seulement 26% seraient actuellement en état de fonctionnement.

Personnes formées dans les domaines de la commercialisation, transformation, post-production (RIMS 1)

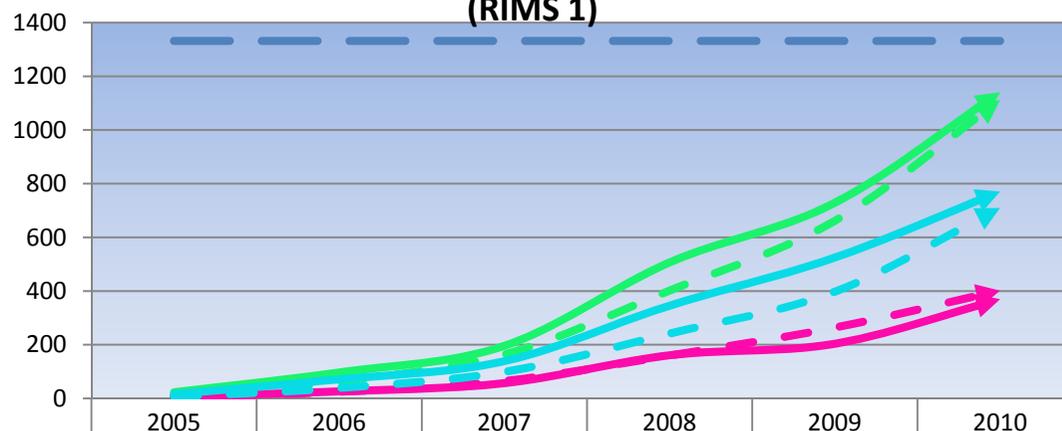


- - - - - →	Personnes formées dans les domaines de la commercialisation, transformation, post-production total prévu
— — — — — →	Personnes formées dans les domaines de la commercialisation, transformation, post-production total réalisé

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personnes formées dans les domaines de la commercialisation, transformation, post-production total prévu	10	64	164	402	662	1112
Personnes formées dans les domaines de la commercialisation, transformation, post-production total réalisé	23	97	196	507	729	1141

Le nombre de personnes formées dans les domaines de la commercialisation, transformation et post production est de 1141 fin 2010. On note une progression régulière du nombre de formés avec une légère baisse entre 2008 et 2009. L'objectif global a été atteint à plus de 86%. Cependant, deux fois plus d'hommes ont bénéficié de cette formation, puisqu'on décompte 771 hommes contre seulement 370 femmes formées.


Groupes de commercialisation (RIMS 1)

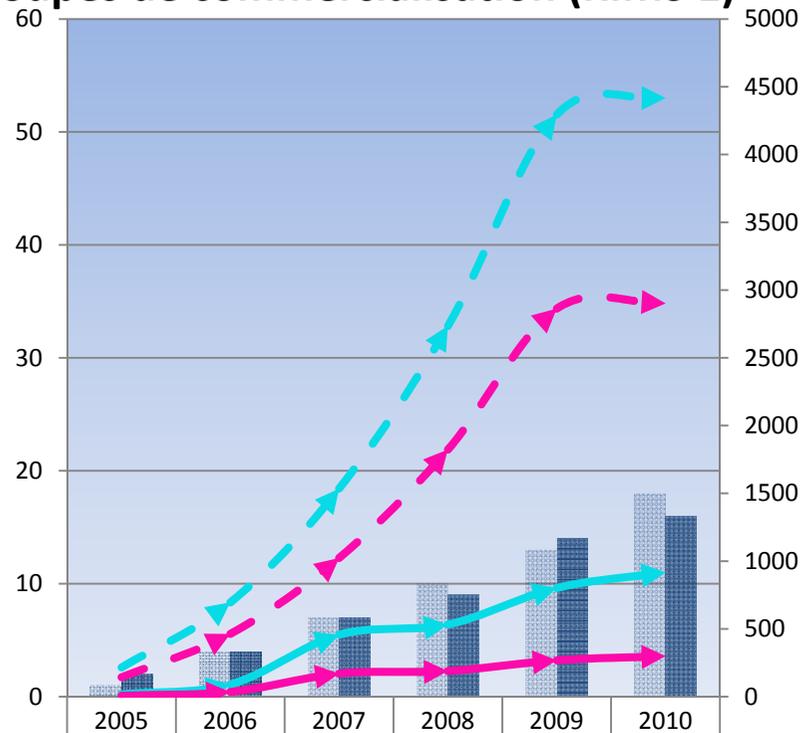

Groupes de commercialisation formés/consolidés prévu	1	4	7	10	13	18
Groupes de commercialisation formés/consolidés réalisé	2	4	7	9	14	16
Hommes membres des groupes de commercialisation prévu	216	696	1536	2736	4296	4418
Hommes membres des groupes de commercialisation réalisé	19	91	458	533	803	917
Femmes membres des groupes de commercialisation prévu	144	464	1024	1824	2864	2902
Femmes membres des groupes de commercialisation réalisé	8	36	171	190	269	300

16 groupes de commercialisation ont été formés ou consolidés depuis le début du projet en 2005. L'objectif est quasiment atteint puisqu'il se situe à 18 groupes (89%). Par contre, l'adhésion escomptée à ces groupes n'a pas été atteinte. L'objectif a été réalisé à 11% pour les hommes et à seulement 5% pour les femmes à deux ans de la clôture du projet. Une nouvelle fois le nombre d'adhérents du sexe féminin est beaucoup moins important puisqu'on compte 3 fois moins de femmes que d'hommes. Il faudra redoubler d'efforts dans les prochaines années afin de pouvoir couvrir l'objectif fixé.

Groupes de producteurs et organisations faîtières (RIMS 1 et 2)

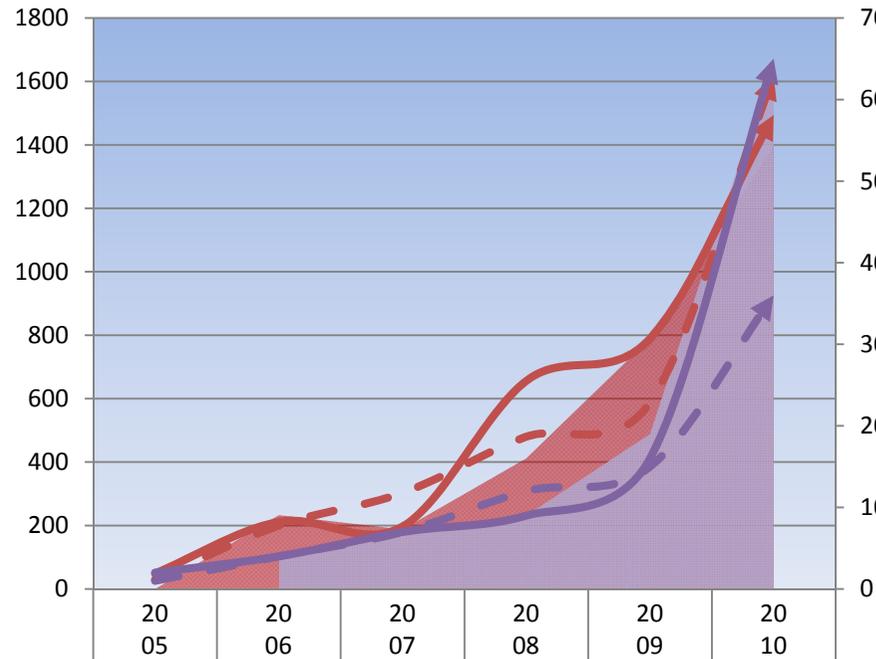


Fin 2010, plus de 1494 groupes de producteurs et 65 organisations faîtières ont été créés ou renforcés. Les cibles globales sont atteintes respectivement à 40% et 71%.

La durabilité des groupes nouvellement appuyés/formés semble plutôt bonne, puisque tant au niveau des organisations faîtières que des organisations de producteurs l'ensemble des groupes est encore actif (respectivement 100% et 93%).


 Groupes de producteurs opérationnels/fonctionnels (RIMS 2)	0	233	188	412	789	1399
 Organisations faîtières opérationnels/fonctionnels (RIMS 2)		4	7	9	19	65
 Groupes de producteurs prévu (RIMS 1)	30	200	303	480	588	1619
 Groupes de producteurs réalisé (RIMS 1)	49	212	197	656	789	1494
 Organisations faîtières prévu (RIMS 1)	1	4	7	12	15	36
 Organisations faîtières réalisé (RIMS 1)	2	4	7	9	16	65

Routes construites/remises en état (RIMS 1)

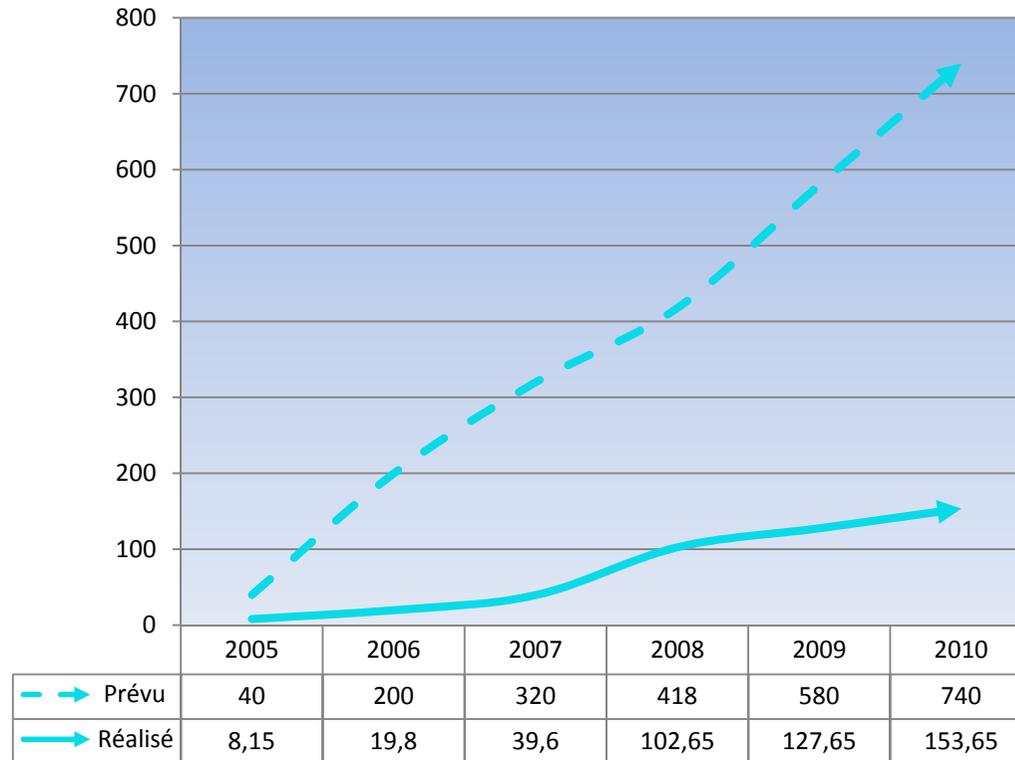

La distance de routes qui aurait dû être construites ou remises en état est très en deçà des prévisions. Seulement 153 km contre un objectif de 740 km ont été réalisés et ce à deux ans de la fin du projet (20% seulement de la cible globale). Il serait ici intéressant de mesurer la durabilité des travaux menés en ajoutant un indicateur du type "routes encore en fonctionnement".


Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état (en hectares) RIMS 1 et 2

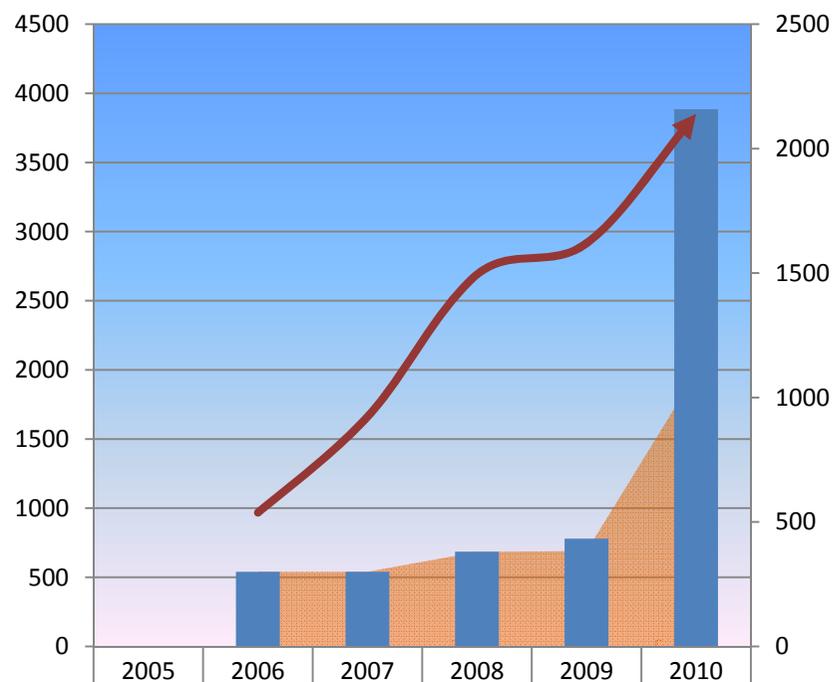

	Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements agricoles (RIMS 2)		540	540	685	691	1976
	Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état (hect) (RIMS 1)		540	540	685	780	3884
	Paysans travaillant sur les périmètres remis en état (RIMS 2)		538	923	1495	1620	2140

Les périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état par le projet couvrent maintenant une surface de plus de 3884 hectares. Avec un taux de réalisation à plus de 93% l'objectif fixé en début de projet devrait être atteint. Ces aménagements ont permis d'augmenter les surfaces cultivables de plus de 1976 hectares. Ces surfaces devenues productives ont fait travailler plus de 2000 paysans. Les aménagements plus conséquents réalisés en 2010 devraient encore faire augmenter ces chiffres dans les années à venir.


Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique

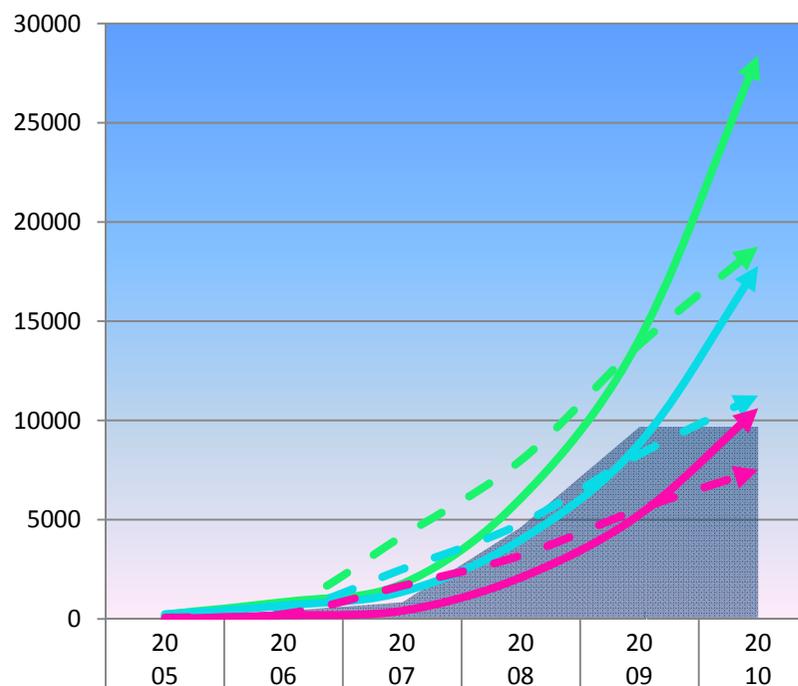

Personnes ayant adopté les techniques agricoles recommandées	0	400	833	4623	9681	9681
Total prévu	150	610	4174	7996	13826	18772
Total réalisé	227	855	1768	6075	14093	28417
Hommes prévu	90	366	2505	4798	8296	11264
Hommes réalisé	227	677	1360	3988	8837	17799
Femmes prévu	60	244	1669	3198	5530	7508
Femmes réalisé	0	178	408	2087	5256	10618

Plus de 28 417 personnes ont été formées aux méthodes de production tant agricole, animale qu'halieutique. Le nombre de femmes formées reste inférieur à celui des hommes (un ratio moyen d'une femme pour 1,6 homme). L'objectif visé est dépassé pour les hommes (105%) et presque atteint pour les femmes (94%) compte tenu des performances de 2010. Cependant, seuls 34% des producteurs formés semblent adopter les techniques et méthodes de production proposées par le projet.

Groupes de gestion de l'infrastructure formés/consolidés (RIMS 1)

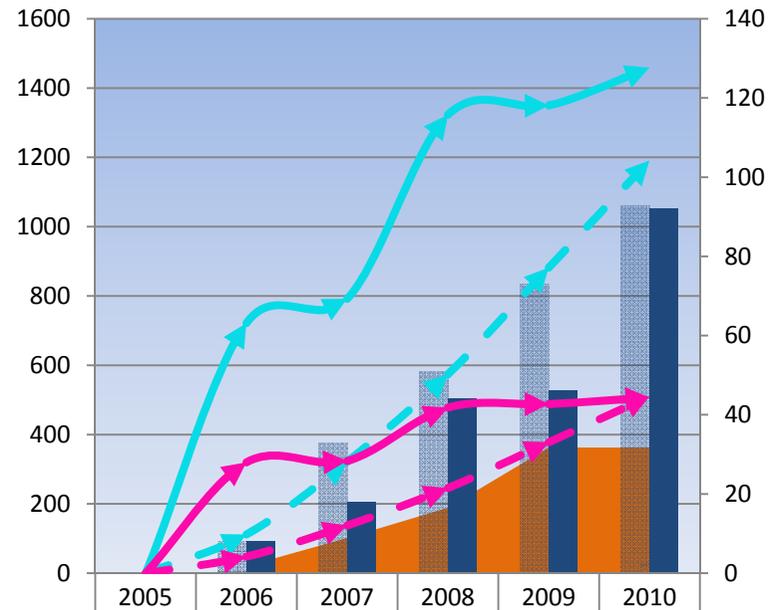

	Personnes ayant adopté les techniques d'entretien des infrastructures recommandées		20	102	189	363	363
	Groupes de gestion de l'infrastructure formés/consolidés prévu	0	8	33	51	73	93
	Groupes de gestion de l'infrastructure formés/consolidés réalisé	0	8	18	44	46	92
	Hommes membres des groupes de gestion de l'infrastructure prévu	0	112	322	574	882	1191
	Hommes membres des groupes de gestion de l'infrastructure réalisé	0	722	792	1323	1350	1459
	Femmes membres des groupes de gestion de l'infrastructure prévu	0	48	138	246	378	510

Le nombre de groupes de gestion de l'infrastructure renforcés ou créés est de 92 et suit les progressions annuelles prévues. L'objectif fixé à 97 groupes devrait être atteint avant la fin du projet. La progression du nombre de membres connaît quant à elle des irrégularités et n'est pas en phase avec les objectifs annuels et ce tant pour les hommes que pour les femmes. Par contre et ceci constitue un point positif, les objectifs sont atteints à plus de 99% pour les hommes et à 80% pour les femmes avec plus de 1459 et 507 membres respectivement. Toutefois le nombre de femmes reste très inférieur à celui des hommes (elles sont quasiment 3 fois moins nombreuses). Le nombre de personnes ayant adopté les techniques recommandées par le projet en terme de gestion de l'infrastructure reste quant à lui assez faible (363). Ceci pose la question de la pertinence des techniques proposées, du mode de transfert des connaissances
