



PROGRAMME DE LA 4È SUPERVISION DE PARECAM



30 MAI 2011: Atelier de démarrage

31 Mai – 11 Juin 2011: Visite sur terrain des 5 équipes

12 Juin 2011: Rédaction AM

**13 – 15 Juin 2011: Entretiens avec les différents
partenaires et parties prenantes du Programme à
Antananarivo**

**16 Juin 2011: Restitution validation de l'AM + Réunion
CNP**



ATELIER DE DEMARRAGE DE LA 4È SUPERVISION DE PARECAM



HEURES	ACTIVITES	INTERVENANT
9h 00 à 9h15	Ouverture de l'Atelier	SG/- MinAgri
9h 15 à 9h30	Présentation du programme de la mission et de l'Agenda de l'atelier de démarrage	UGP/PARECAM
9h 30 à 10h15	Présentation des réalisations de PARECAM suivi de Q/R	UGP/PARECAM
10h15 à 10h30	Pause café	
10h30 à 13h10	Présentations des Projets suivies de Q/R	Coordonnateurs des Projets
13h15 à 14h15	Déjeuner	
14h30 à 15h00	Logistique des descentes sur terrain	CAPFIDA
15h00 à 15h15	Clôture de l'atelier	SG/MinAgri



PROGRAMME D'APPUI À LA RÉSILIENCE AUX CRISES ALIMENTAIRES À MADAGASCAR (PARECAM)

Avancement global au 30 Avril 2011

30 Mai 2011



Evaluation de l'exécution du PARECAM



- 1/ Réalisations physiques au 30 Avril 2011
vs au 31 Décembre 2010
- 2/ Réalisations physiques vs Réalisations
financières



Indicateur global



INDICATEURS D'ACTIVITES FIDA/UE	UNITE	PARECAM Avril 11			PARECAM Déc 2010		
		Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%
Familles et personnes touchées par le Programme							
Familles touchées directement par le Programme	<i>nbre</i>	100 395	105 204	105%	100 395	100 433	100%
Personnes touchées par le Programme (5,25 pers./famille)	<i>nbre</i>	527 074	552 321	105%	527 074	527 273	100%
Femmes directement touchés par le programme	<i>nbre</i>	52 706	52 411	99%	52 707	52 727	100%




R 1. Aménagements agricoles



INDICATEURS D'ACTIVITES FIDA/UE	UNITE	PARECAM Avril 11			PARECAM Déc 2010		
		Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%
Bénéficiaires de parcelles aménagées/drainées	nbre	23 305	17 000	73%	21 310	14 978	70%
Etudes d'aménagement réalisées	ha	12 099	11 857	98%	12 099	11 857	98%
Nouvelles superficies irriguées aménagées	ha	6 695	3 432	51%	6 195	2 834	46%
Superficies irriguées réhabilitées	ha	6 460	5 232	81%	6 460	4 468	69%
Total superficie aménagée		13 155	8 664	66%	12 655	7 302	58%
AUE formées/appuyées	nbre	122	74	61%	125	71	57%
Superficies drainées suite à aménagement	ha	3 490	1 381	40%	3 490	1 697	49%
Superficies maraîchères aménagées	ha	50	45	89%	50	41	81%
Superficies aménagées en micro irrigation	ha	36	0,39	1%			
Kits de micro-irrigation mis en place	nbre	2 225	29	1%	2 225	25	1%
Superficies de Tanety aménagé	ha	440	451	102%	440	484	110%



R 1. Aménagements agricoles

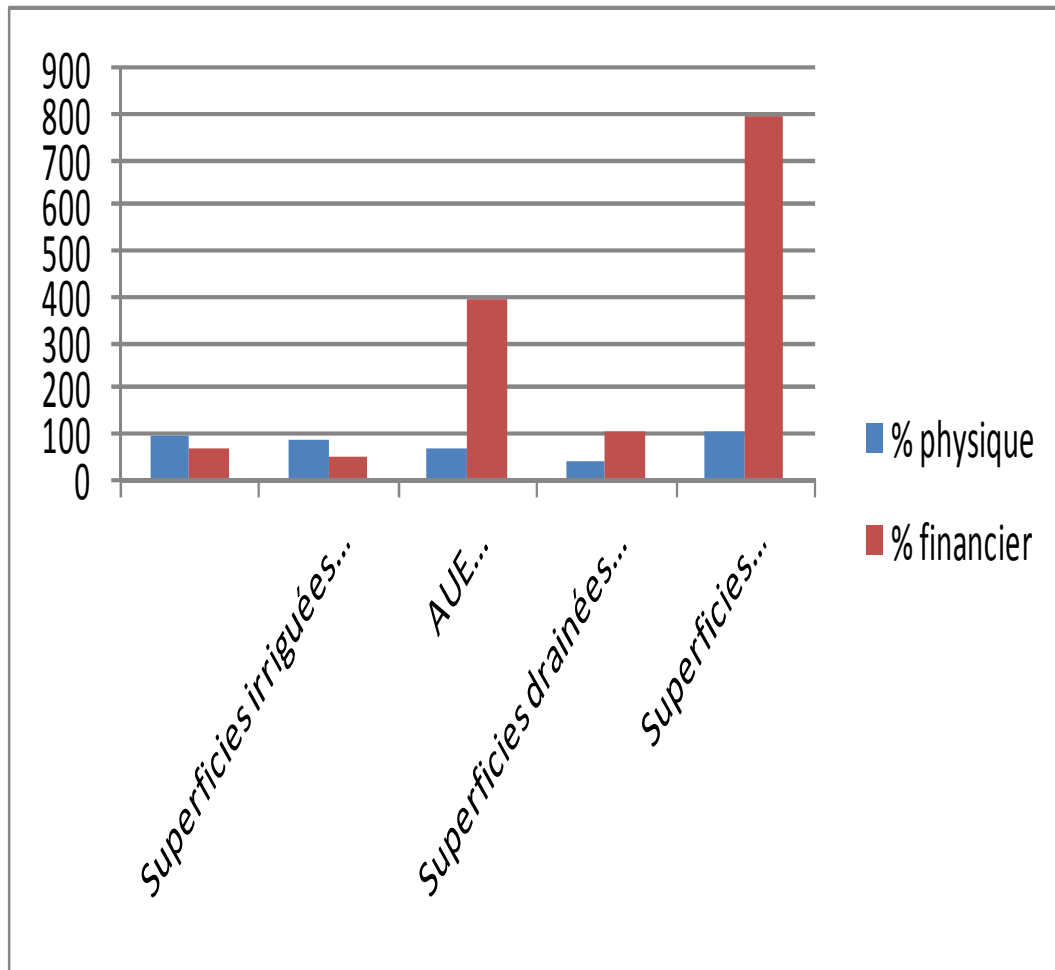

La formation des AUE, l'indicateur physique = nombre des AUEs Indicateur financier = indemnités des individus membres des AUE. AUEs peuvent compter un grand nombre de membres.

Les superficies irriguées réhabilitées , coût par ha = 1,97 millions d'Ariary. (Aménagement réhabilitation et protection de digue)

Superficies aménagées en micro-irrigation, recommandation dernière mission = utilisation de micro-irrigation au SUD et la contractualisation avec ASVF




R 2. Intensification agricole



INDICATEURS D'ACTIVITES FIDA/UE	UNITE	PARECAM Avril 11			PARECAM Déc 2010		
		Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%
Producteurs touchés par le résultat 2	nbre	99 790	97 066	97%	90 290	80 869	90%
Total superficie intensifiée		25 625	20 586	80%	40 799	17 661	43%
Production agricole totale avec le Programme	t	73 249	35 845	49%	100 544	26 272	26%
Semences de pré-base mise à disposition	kg	8 600	2 210	26%	900	2 275	253%
Semences améliorées produites		1 417	135	10%	1 195	106	9%
Semences améliorées distribuées		449	457	102%	1 747	370	21%
Arbres fruitiers/autres plantés	pieds	227 000	115 594	51%	364 000	59 924	16%
Engrais distribués	t	2 222	1 509	68%	3 221	1 774	55%
Produits phytosanitaires distribués	kg ou l	16 430	5 983	36%	21 430	7 104	33%
Equipements agricoles distribués	nbre	24 131	13 621	56%	28 831	11 890	41%
Appui à la mise en place d'ateliers de fabrication et d'entretien	nbre ateliers	22	5	23%	22	5	23%
Fonds de roulement intrants	EUR	73 137	0	0%	73 137	0	0%
Animaux vaccinés		102 000	115 392	113%	102 000	101 234	99%
Micro-projets appuyés	nbre	20 300	24 000	118%	20 623	17 503	85%
Champs écoles paysans	nbre bén.	7 280	9 568	131%	7 280	9 838	135%



R 2. Intensification agricole

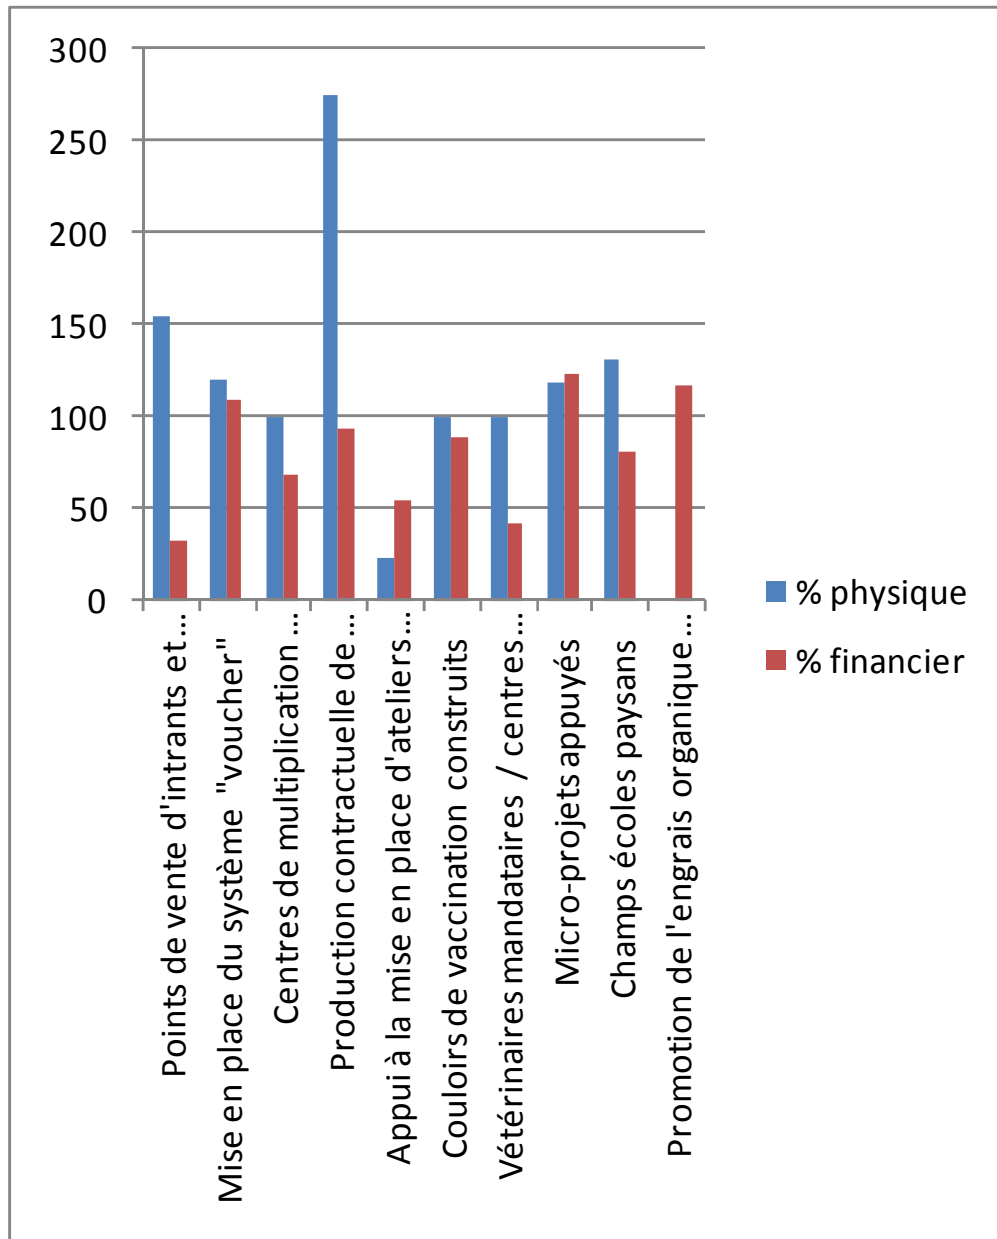

Les réalisations physiques en terme de production contractuelle de semence a grimpé à la suite de la recommandation de la mission précédente d'apporter plus d'appui en semences

Appui à la mise en place d'ateliers de fabrication inclut les frais de formation.

Appui aux microprojets, indicateurs physiques = nombre bénéficiaires toutes filières et surfaces confondues ; les dépenses accumulent la différenciation entre surfaces appuyées, filières et nombre de bénéficiaires.

Promotion de l'engrais organique, réalisation physique en terme de nombre de paysans formés ; prévision =0 par défaut




R 3. Marchés de produits vivriers



INDICATEURS D'ACTIVITES FIDA/UE	UNITE	PARECAM Avril 11			PARECAM Déc 2010		
		Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%
Producteurs concerné par le résultat 3	nbre	7 000	5 352	76%	7 600	4 586	60%
GCV construits	nbre	43	21	49%	45	16	36%
Capacité de stockage GCV installée	t	1 995	890	45%	1 995	635	32%
Tonnage objet de crédits GCV	t	1 898	526	28%	1 898	496	26%
Magasins de stockage construits	nbre	17	20	118%	17	19	112%
Capacité de stockage magasin installée	t	700	200	29%	700	190	27%
Tonnage commercialisé	t	2 064	288	14%	2 064	262	13%



R 3. Marchés de produits vivriers

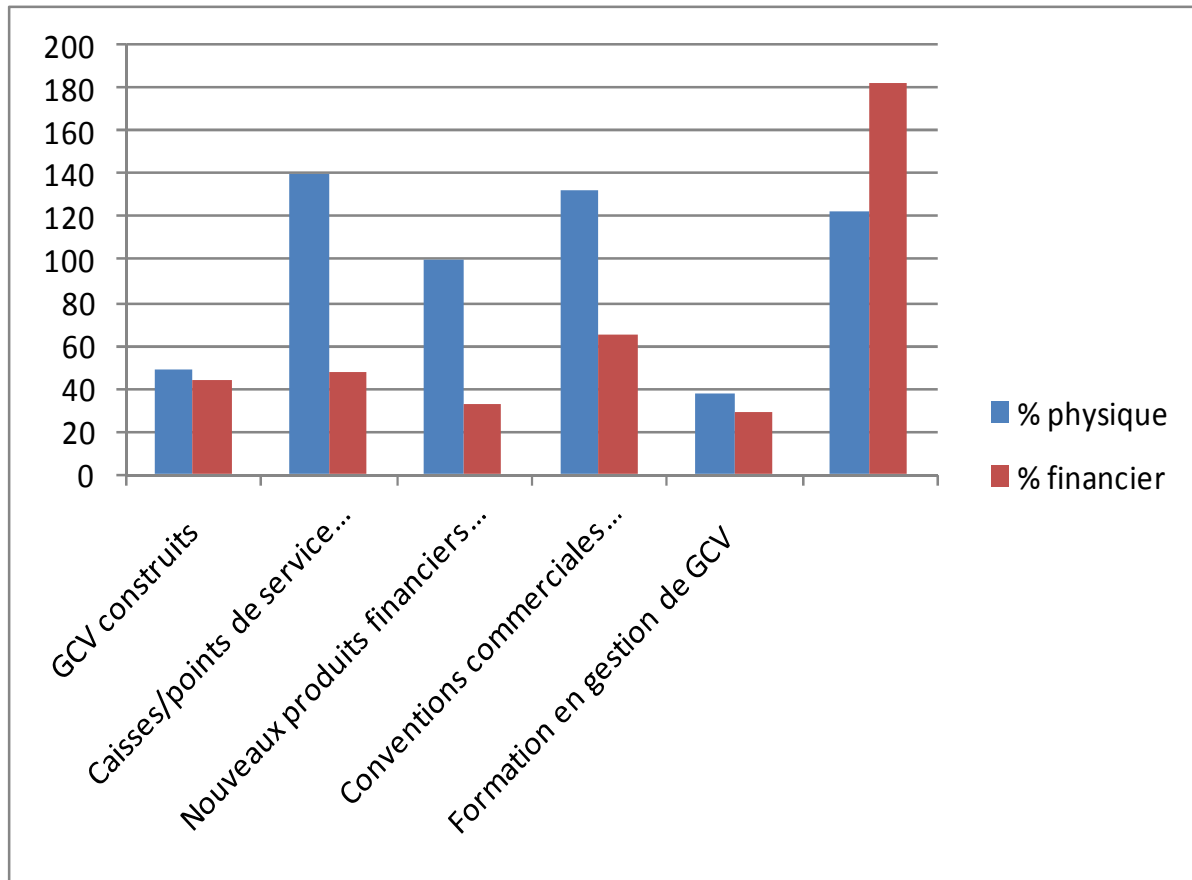

Encadrement technique pour la production améliorée.
Unité de l'indicateur les réalisations physiques = "nombre" (invariable en cette période)

Indicateur finance = montant décaissé (ascendant jusqu'à la fin des contrat)



R 4. Pérennisation des méthodes, appui à la stratégie agricole



- Appui à 16 CSA (16 CSA en Décembre 2010)
- Rapport de l'étude sur la sécurité alimentaire et la nutrition (PAM)
- Rapports des 4 études de capitalisation de PARECAM
- Rapport sur les mesures d'impact de PARECAM
- Objets de visibilité de PARECAM: logo, T-shirt, casquettes, Affiches, Dépliants, Kakemono, films.
- Journée PARECAM
- Mise à jour sites web de PARECAM



R 4. Pérennisation des méthodes, appui à la stratégie agricole



L'analyse des réalisations physiques vs Réalisations financières sera faite lorsque les données des indicateurs de la R4 concernant les rubriques *Fonctionnement, Gestion, Suivi et Communication* seront consolidées et mises à disposition



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
