

PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX PPRR

RAPPORT SEMESTRIEL DE SUIVI ET EVALUATION (JANVIER 2009 - JUIN 2009)

A. Avancement d'exécution

Exécution prévue pour le semestre écoulé (sur la base du PTBA 2009)

COMPOSANTE 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX

- Collecter 3 tonnes de piments séchés rouges, 1,5 tonnes de piments verts frais, 1,5 tonnes de piments rouges frais ;
- Collecter 6 tonnes de miel ;
- Collecter 300 tonnes de paddy ;
- Collecter 4 tonnes d'huiles essentielles.
- Construire 6 bâtiments de CAM (Pôles : Toamasina suburbaine, Iazafo Nord, Sainte Marie, Onibe, Fanandràna et Vohitranivona/Ambinaninony) ;
- Former 250 producteurs sur l'amélioration des qualités des produits ;
- Doter des fonds de roulements à 7 anciens CAM : Soanierana, Anjahambe, Vohilengo, Manantsatrana, Manompana, Iazafo Nord et Toamasina Suburbaine ;
- Doter des fonds de roulements à 6 nouveaux CAM : Sainte Marie, Fanandràna, Ampasimbe Onibe, Ambinaninony/Vohitranivona, Anivorano Est et Mahatsara ;
- Créer 5 pôles ;
- Réhabiliter ou aménager 162 km de pistes ;
- Former soixante (60) personnes dont cinq (05) représentants (par pôle) des associations des usagers de l'eau (AUP) en technique d'entretien, gestion et protection ;
- Former soixante (60) personnes dont cinq (05) représentants (par pôle) des associations des usagers de l'eau (AUE) en technique d'entretien, gestion et protection ;
- Former trente (30) personnes dont deux (02) représentants (par pôle) des autorités locales en maîtrise d'ouvrage ;

COMPOSANTE 2 - APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE

- Appuyer l'élaboration/réactualisation de 40 PDF ;
- Mettre en place des structures formelles pour 5 CDP/CCD et 5 Unions : Onibe, Fanandràna, Ambinaninony/Vohitranivona, Anivorano Est et Mahatsara ;
- Former les socio organisateurs en gouvernance locale et décentralisation, développement organisationnel, technique d'animation et de communication rurale et technique d'appui aux OP ;
- Redynamiser les guichets fonciers qui sont mis en place et mettre en place les 04 nouveaux guichets fonciers ;
- Réaliser la campagne d'alphabétisation des adultes ;
- Financer 325 Microprojets ;
- Recruter et mettre en place des Organismes d'appui en Conseil agricole (OA CA) ;
- Renforcer la capacité technique des 52 paysans leaders sur les itinéraires techniques de production végétale, animale et de transformation des produits agricoles ;
- Mettre en place les parcelles de démonstrations par spéculation ;
- Organiser des visites échanges inter pôle et hors région ;
- Mettre en place et rendre fonctionnels 45 pépinières villageoises ;

COMPOSANTE 3 – APPUI AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX

- Construire 05 points de services ;
- Rendre opérationnelle 100 caisses mixtes ;
- Sensibiliser 240 producteurs sur l'élimination des contraintes à l'offre des services financiers ;

- Réaliser des séances de formation des agents de crédit de l'OTIV.

COMPOSANTE 4 - APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME

- Mettre en place des panneaux d'indications des sites d'activités ;
- Faire des émissions dans divers stations radiophoniques ;
- Améliorer le réseau de communication interne du personnel de l'UGP ;
- Effectuer les aménagements de bureau ;
- Mettre en place un nouveau système de gestion de patrimoine ;
- Améliorer la structure de l'UGP ;
- Renforcer la compétence du personnel ;
- Auditer les comptes de l'UGP ;
- Relancer les demandes d'augmentation de dépôts initiaux FIDA et OFID ;
- Assurer la collecte périodique des données sur les activités, les résultats obtenus, les effets et impacts du Programme ;
- Assurer la collecte des données entrant dans le cadre de suivi des impacts du Programme.

Exécution réalisée pendant le semestre écoulé

COMPOSANTE 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX

- 850 kg de piments séchés rouges, 1444 kg de piments verts frais, 575 kg de piments rouges frais collectés dans les CAM Maningory et Toamasina Suburbaine et à travers les groupements, pendant le 1^{er} semestre (Opérateurs acheteurs : 450 kg pour HAFEJEE et 55 kg pour un particulier - pôle Maningory / CONDIFLASH, Société Masoandro, MALAGASY Export et marché local pour Toamasina Suburbaine) ;
- 1138 kg de miel collectés dans le CAM Maningory en 2009. (Opérateurs acheteurs : Société Atsinanana de Fénérive - Est, Idéal de Toamasina, Escal Food de Toamasina, Société Wu Chao Ying de Toamasina et Bongou de Tananarive) ;
- 107 tonnes de paddy collectés au niveau de 8 pôles pendant le premier semestre. Les pôles concernés par la collecte sont : Maningory, Izafo Sud, Soanierana, Vohilengo, Manantsatrana, Manompana, Izafo Nord et Toamasina Suburbaine ou Ivoloïna. Collecte en cours jusqu'au mois d'Août 2009 ;
- 555 kg d'huiles essentielles collectées au niveau de 3 CAM (Soanierana, Anjahambe et Manompana). Opérateur partenaire pour les achats : Monsieur LEONG ponne Wang de la Société Succession LEONG Teck, plusieurs autres opérateurs vont rejoindre cette société pour le second semestre ;
- 01 bâtiment de CAM construit dans le pôle Manantsatrana et deux autres en cours de construction dans le pôle Toamasina suburbaine et Izafo Nord. Processus d'identification des terrains de construction et constitution des coopératives bénéficiaires en cours, pour cinq (05) autres Centre d'Accès aux Marchés (CAM) ;
- 115 personnes formées dans le processus et opération post – récolte, de la transformation et de la commercialisation dont 16 des femmes ;
- 4 CAM dotés d'équipements standards (Pôles Soanierana, Anjahambe, Manompana et Izafo Nord) ;
- 7 CAM dotés de fonds de roulements (Pôles Maningory, Soanierana, Anjahambe, Vohilengo, Manantsatrana, Manompana et Izafo Nord) ;
- 5 pôles créés. Il s'agit des pôles Ampasimbe Onibe ou *Onibe*, Fanandràna ou *Ivondro*, Ambinaninony/Vohitravivona ou *Rongaronga*, Anivorano Est ou *Rianila* et Mahatsara ou *Iaroka* ;
- 10 kms de pistes réhabilitées, 15 kms en cours de réhabilitation et 38 kms en phase d'attribution de marché ;
- 32 personnes représentants des autorités, des associations des usagers de l'eau et des pistes formées en technique d'entretien, de gestion et de protection, dont 3 des femmes. D'autres formations prévues pour le second semestre ;

COMPOSANTE 2 - APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE

LA BASE PRODUCTIVE

- 48 Plan de Développement de Fokontany (PDF) élaborés dans les 15 pôles du Programme ;
- 06 Comités de Développement des Pôles (CDP) mis en place pendant le 1er semestre, il s'agit du CDP des pôles Ampasimbe Onibe, Foulpointe, Fanandràna, Ambinaninony/Vohitranivona, Anivorano Est et Mahatsara ;
- 15 socio organisateurs formés en gouvernance locale et décentralisation, développement organisationnel, technique d'animation et de communication rurale et technique d'appui aux OP ;
- 24 personnes formées sur le fonctionnement et l'opérationnalisation du Centre des ressources et d'information Foncière (CRIF) et des Guichets Fonciers à Fénérive – Est, dont 5 des femmes ;
- 572 Organisations Paysannes et 9 unions fonctionnelles travaillant avec le Programme dans sa zone d'intervention ;
- 6 077 personnes formées en gestion communautaire dont 1805 des femmes ;
- 7 483 personnes ayant participées aux formations sur l'alphabétisation fonctionnelle dans les 9 premiers pôles, dont 3554 des femmes. Il s'agit du fruit de la collaboration avec la Direction de l'alphabétisation (DALPHA) ;
- 112 microprojets financés et 942 bénéficiaires dont 438 des femmes ;
- 17 Techniciens agricoles avec 2 superviseurs de zone mis à la disposition du Programme par le consortium qui assure le rôle de l'Organisme en Conseil Agricole (OA CA) dans les 8 premiers pôles. Processus de passation de marché en cours pour le recrutement d'un OA CA qui va mettre à la disposition du Programme les techniciens agricoles au niveau des 05 pôles d'intervention de la région Atsinanana ;
- 96 personnes/formation de paysans leaders sur les itinéraires techniques de production végétale, animale et de transformation des produits agricoles ;
- 51 pépinières villageoises mises en place et fonctionnelles dont 3 en moyenne par pôle ;

COMPOSANTE 3 – APPUI AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX

- Trois (03) études de faisabilité économique et financière d'implantation d'Institution de Microfinance effectuées. Construction planifiée pour le second semestre ;
- 533 producteurs ayant participé aux séances de sensibilisations sur l'élimination des contraintes à l'offre des services financiers ;
- 61 caisses mixtes opérationnelles comprenant 984 membres avec 63 889 USD de crédit octroyés ;
- 38 bénéficiaires de crédit GCV lié à l'expérimentation avec 9 716 USD de crédit débloqués dans les pôles Maningory et Manantsatrana ;
- 50 bénéficiaires de crédit de campagne sur 60 prévus avec 4 194 USD de crédit débloqué.

COMPOSANTE 4 - APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME

- 240 panneaux d'indication des sites d'activités mis en place ;
- 55 articles et émissions audiovisuelles parus sur le PPRR, à travers des séquences de films, des émissions et divers interventions ponctuelles des représentants du PPRR dans les médias nationaux et locaux ;
- 8 compléments d'interphones acquis et 1 réseau informatique étendu aux nouveaux ordinateurs ;
- 1 Etagère de rangement installé à l'intérieur d'un dispositif pour archivage ;
- 1 fiche d'intervention de réparation de matériels informatiques conçue et utilisée pour tout le personnel de l'UGP ;
- Restructuration interne : l'ex-responsable d'antenne affecté au poste de responsable du PARECAM à Toamasina ; désignation d'un nouveau responsable d'antenne, recrutement d'un chauffeur, désignation du nouveau correspondant de projet PPRR, mis à jour des Termes de Référence des secrétaires techniques, nomination des assistants comptables au poste de comptable juniors sans changement de catégorie salariale ;
- 2 personnes formées en gestion de stock assurée par INSCAE, 1 échange d'expérience sur l'Administration de Prêt FIDA effectuée par le RAF auprès du projet PROSPERER, 4 personnes formées en management d'équipe de projet organisé par la CAP/FIDA, 4 personnes formées en procédures de passation des marchés des projets FIDA, 3 gardiens et 1 femme de ménage bénéficiaires d'une formation sur l'entretien de l'enceinte d'un bureau (entretien gazon et plants de décoration) ;

- 1 mission d'appui pour la revue des états financiers avant audit réalisée par le Conseiller financier des projets FIDA du 03 au 07 mai 2009 ;
- 1 audit externe assuré par le Cabinet NPNM Audit du 03 au 19 juin 2009 ;
- Une mission de supervision en deux phases durant le mois d'Avril et Mai 2009 effectué par le FIDA dans la zone d'intervention du PPRR ;
- 1 Amendement N°2 de l'Accord de Prêt FIDA en cours d'approbation pour l'augmentation du dépôt initial FIDA ;
- 1 relance effectuée, adressée au responsable des opérations OFID lors de son passage à Madagascar du 18 au 26 janvier 2009.

Note par rapport à la situation financière du Programme :

Situation par rapport au PTBA au 30 Juin 2009 : Taux de réalisation pour tout financement confondu : 15,4%, dont OPEP : 3,7 %, FIDA : 35,4%, Gouvernement : 3,9 %.

Composante 1 : Un taux de 6,4 %

Composante 2 : Un taux dépassant juste le 1/5ème du budget prévu avec 22,2 % ;

Composante 3 : Un taux avoisinant le tiers du budget prévu avec 30,9 % ;

Composante 4 : Un taux avoisinant la moitié du montant prévu pour un taux de 41,4 %.

Le taux de décaissement est très faible notamment au niveau de la composante 1 sur laquelle l'OFID participe à 62% du budget prévu pour l'année, du fait que les deux DRFs OFID envoyées depuis le premier trimestre 2009 ne sont pas encore honorées par ce bailleur de fonds jusqu'à présent. Ainsi, la notification des grands travaux de désenclavement qui constituent 43% du budget de l'année 2009 reste en instance en attendant la situation d'approvisionnement de fonds OFID.

Pour FIDA, la construction des deux bâtiments des CAM, les greniers communautaires villageois, les points de service de l'OTIV sont prévus pour le deuxième semestre. Les autres activités telles que la situation des références et l'élaboration des comptes d'exploitation par spéculation, les marchés y afférents sont en cours de traitement au niveau de l'unité passation des marchés et le déboursement de fonds se fera également au cours du deuxième semestre 2009. Et enfin, pour le Gouvernement Malagasy, la crise a entraîné le changement des signataires et des responsables, le programme connaît des problèmes lors des engagements de dépenses notamment les taxes qui constituent 84% du montant total de la contribution du Gouvernement prévue pour cette année 2009.

Par rapport au financement total du Programme au 30 Juin 2009 : 33,01 % du montant total du financement du Programme dont FIDA : 43,04 %, OPEP : 27,70 %, Gouvernement : 14,13 %.

Les dépenses en génie civil financées à 70% par les fonds OPEP, le reste ayant été financé par le FIDA, le GDM et les bénéficiaires. D'une manière générale, dans toutes les catégories de dépenses, le FIDA est le principal financeur. L'OPEP a participé à hauteur de 46% dans la catégorie "Etudes". Le GDM a participé d'une manière significative dans les catégories "génie civil", "équipements et véhicules" et "coûts de fonctionnement". Le budget de la catégorie "Equipement" a été réalisé à hauteur de 68,6%, vient ensuite la catégorie "coûts de fonctionnement" avec 64,9%, et la catégorie "Assistance technique" avec 57,5% de réalisation. Rien n'a été dépensé du budget "non alloué". Par rapport au cumul décaissé, 71,1% provient du FIDA, 20,4% de l'OPEP, 7,1% du GDM, 1,26% des bénéficiaires et 0,14% des opérateurs.

Exécution prévue pour le semestre prochain (sur la base du PTBA 2009)

COMPOSANTE 1 APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX

- Construire 6 bâtiments de CAM (Pôles : Toamasina suburbaine, Izafo Nord, Sainte Marie, Onibe, Fanandràna et Vohitranivona/Ambinaninony) ;
- Former 250 producteurs sur l'amélioration des qualités des produits ;
- Doter des fonds de roulements à 7 anciens CAM : Soanierana, Anjahambe, Vohilengo, Manantsatrana, Manompana, Izafo Nord et Toamasina Suburbaine ;
- Doter des fonds de roulements à 6 nouveaux CAM : Sainte Marie, Fanandràna, Ampasimbe Onibe, Ambinaninony/Vohitranivona, Anivorano Est et Mahatsara ;

- Organiser des séances d'évaluation de résultats de chaque activité de commercialisation (par spéculation) ;
- Réhabiliter ou aménager 162 km de pistes ;
- Entretenir 67 kms de pistes et 61 kms de sentiers piétonniers ;
- Former soixante (60) personnes dont cinq (05) représentants (par pôle) des associations des usagers de l'eau (AUP) en technique d'entretien, gestion et protection ;
- Former soixante (60) personnes dont cinq (05) représentants (par pôle) des associations des usagers de l'eau (AUE) en technique d'entretien, gestion et protection ;
- Former trente (30) personnes dont deux (02) représentants (par pôle) des autorités locales en maîtrise d'ouvrage ;
- Elaborer une politique et mécanisme de financement des dégâts cyclonique et de relance de la production agricole ;

COMPOSANTE 2 - APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE

- Appuyer l'élaboration/réactualisation de 40 PDF ;
- Mettre en place des structures formelles pour 5 CDP/CCD et 5 Unions : Onibe, Fanandràna, Ambinaninony/Vohitravivona, Anivorano Est et Mahatsara ;
- Former les socio organisateurs en gouvernance locale et décentralisation, développement organisationnel, technique d'animation et de communication rurale et technique d'appui aux OP ;
- Redynamiser les guichets fonciers, mis en place et créer 04 nouveaux guichets fonciers ;
- Appuyer le fonctionnement de la cellule régionale du Programme Nationale Foncier (PNF) d'Analanjorofo ;
- Construire cinq (05) infrastructures socio collectives (Pôles : Manompana, Manantsatrana, Izafo Nord, Vohilengo et Toamasina Suburbaine) ;
- Doter en équipements/mobiliers de bureau et formation technique les CDP/Communes ;
- Rendre opérationnelle 46 structures d'entretien des infrastructures ;
- Mettre en place et rendre opérationnelle les organisations paysannes faitières par filière : six OPF et une fédération ;
- Réaliser des visites d'échanges inter pôles ;
- Recruter des Organismes d'appui (OA) en alphabétisation fonctionnelle ;
- Recruter et former 162 alphabétiseurs villageois ;
- Réaliser la campagne d'alphabétisation des adultes ;
- Identifier les micro-périmètres à aménager par pôle ;
- Réaliser des travaux d'aménagement ;
- Financer 325 Microprojets ;
- Acquérir des semences, des guanomad, du matériel végétal, des équipements et des matériels techniques ;
- Recruter et mettre en place des Organismes d'appui en Conseil agricole (OA CA) ;
- Former 15 distributeurs d'intrants ;
- Renforcer la capacité technique des 52 paysans leaders sur les itinéraires techniques de production végétale, animale et de transformation des produits agricoles ;
- Mettre en place les parcelles de démonstrations par spéculation ;
- Organiser des visites échanges inter pôle et hors région ;
- Mettre en place et rendre fonctionnels 45 pépinières villageoises ;
- Améliorer la production vivrière par l'introduction de nouvelles variétés performantes ;
- Acquérir et mettre à la disposition de l'union des apiculteurs SITAM un appareil de fabrication de cire gaufrée ;
- Acquérir une unité de séchage de fruit ;

COMPOSANTE 3 – APPUI AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX

- Construire 05 points de services ;
- Construire 04 nouveaux GCV ;
- Doter les Points de services nouvellement créés en frais de constitution ;
- Doter les Points de services en fonds d'équilibre ;

- Doter 13 Points de services en moto ;
- Animer et appuyer les OP dans le montage de dossier de demande de crédit ;
- Elaborer la stratégie de crédit OTIV/PPRR ;
- Doter l'OA/IMF en fonds de crédit aux plus vulnérables ;
- Réaliser des séances de formation des agents de crédit de l'OTIV.

COMPOSANTE 4 - APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME

- Mettre en place des panneaux d'indications des sites d'activités ;
- Faire des émissions dans divers stations radiophoniques ;
- Auditer les comptes de l'UGP ;
- Relancer les demandes d'augmentation de dépôts initiaux FIDA et OFID ;
- Assurer la collecte périodique des données sur les activités, les résultats obtenus, les effets et impacts du Programme ;
- Assurer la collecte des données entrant dans le cadre de suivi des impacts du Programme.

B. Réalisation des objectifs de développement

Objectifs de développement du projet

L'objectif de développement est la réduction de la pauvreté rurale dans les régions d'Analanjirifo et d'Atsinanana par l'accroissement des revenus ruraux et l'amélioration de la capacité des communautés de base à prendre en charge leurs projets de développement.

L'objectif général du programme est l'accroissement et la sécurisation durable des revenus des petits producteurs dans la zone ainsi que des disponibilités alimentaires et nutritionnelles.

Les objectifs spécifiques sont :

- i. ***L'amélioration de l'accès des producteurs au marché et de la valorisation des produits, à travers :***
 - a. La rationalisation des systèmes de collecte : Amélioration de la qualité des produits proposés sur les filières développés jusqu'ici (miel, piment, huiles essentielles et riz) est bien palpable. On peut l'apprécier par rapport à l'extension des activités des producteurs et des CAM comparées à l'année dernière. Les productions commencent à augmenter petit à petit, malgré le passage du cyclone Ivan, l'année dernière.
 - b. Le renforcement de la position de négociation des petits producteurs : les fédérations par filière commencent à prendre forme : une fédération de pêcheur pour la région Analanjirifo a été créée pendant le 1^{er} semestre. Le désir des responsables des CAM à se regrouper pour défendre leurs intérêts se dessinent petit à petit. Les regroupements continuent les négociations directement avec les opérateurs exportateurs dans le cadre du développement du marché contrôlé de girofle sous l'impulsion de la direction Interrégionale du commerce de Toamasina (produit de qualité, respect de calendrier, régularisation de la fiscalité, etc.). Ils continuent à négocier directement avec les opérateurs avec l'appui des assistants techniques aux CAM, lors des ventes de piments, miel, riz blanc, d'huiles essentielles, de litchis et de girofle. De plus en plus d'opérateurs ont signé des partenariats avec les CAM pour l'achat de leurs produits notamment pour le miel en bocal.
 - c. L'amélioration de la qualité des produits et la valorisation par la transformation : La dotation et la mise à disposition des paysans et du CAM de matériels de traitement post récolte valorise les produits des paysans. L'augmentation des revenus des producteurs de piment travaillant avec le programme est assurée grâce aux séchoirs qui ont été mis à leur disposition (Amélioration de la qualité des piments séchés, réduction de la quantité de piments pourris et augmentation du prix après séchage).
 - d. Le développement de partenariats entre producteurs groupés et opérateurs commerciaux, notamment pour l'accroissement de la valeur ajoutée au stade producteur et l'introduction de nouveaux produits ou labels :
Les opérateurs tels que l'Etablissement Mohamed et SODEXPRO travaillant avec les CAM reconnaissent la maîtrise de la qualité des produits par les paysans formés notamment pour le girofle (CG 3 amélioré). Cette reconnaissance se traduit par les primes de collecte et les

primes de qualité pour les paysans.

- e. L'amélioration des conditions de transport des produits (désenclavement) : Avec la réhabilitation des pistes et des sentiers, les paysans peuvent facilement sortir leurs productions, ont moins de mal pour transporter leurs productions à dos d'homme. Les prix des produits de première nécessité descendent presque automatiquement dans les zones désenclavées. Le nombre des bicyclettes circulant au niveau des zones désenclavées et le nombre des trafics ne cessent d'augmenter après les travaux de désenclavement.


ii. ***L'intensification, l'accroissement et la diversification de la base productive, notamment des populations les plus vulnérables, de façon positive pour l'environnement, grâce à :***

- a. Une amélioration de la gouvernance locale permettant la participation effective des plus vulnérables aux mécanismes de développement : Les OP encadrés par le PPRR ont apporté une participation active dans l'élaboration des plans de développements communautaires. Les vulnérables et les plus démunis sont bien représentés dans ces OP. Le processus participatif adopté pour l'élaboration des plans intègre la vision des pauvres dans la gouvernance en particulier dans la planification du développement. Les OP n'ayant comme membre que les plus vulnérables ont les mêmes droits que les autres et participent au même titre que les autres dans tous les processus de prise de décision où ils sont représentés. Le nombre d'OP travaillant avec le Programme ne cesse d'augmenter.
- b. Le renforcement des organisations de producteurs : Organisés en coopératives formalisées, les producteurs évoluent dans le formel. L'union est devenue un interlocuteur direct des opérateurs à travers le CAM. La mise en place d'une fédération des Pôles au niveau région et au niveau inter-région est actuellement en cours de préparation. Il en est de même de la mise en place des fédérations pour chaque filière appuyé par le Programme. 8 unions au niveau de plusieurs filières ont été mises en place dans quelques pôles : 3 pour le Maïs, 2 pour le riz, 1 pour le curcuma, 1 pour la pêche et 1 pour la culture maraîchère. Une fédération de pêcheur a été mise en place au niveau de la région Analanjirifo.
- c. L'amélioration de l'accès au crédit rural : Les membres servis par les points de services sont actuellement de 7287, alors qu'ils n'étaient que 3779 à la signature du contrat, prouve déjà les efforts effectués par le Programme dans le secteur. Plusieurs gamme de crédit ont été offertes aux paysans et un crédit de soudure est actuellement en expérimentation dans deux pôles : Maningory et Manantsatrana.
- d. La fourniture d'un conseil agricole de qualité et la fourniture d'appui financier à l'investissement par les producteurs : L'augmentation du nombre des paysans encadrés, par les techniciens du Programme, qui sont actuellement à 2447, alors que les bénéficiaires des microprojets ne sont que 1643, démontre l'intérêt que portent les paysans de la zone d'intervention du Programme aux services fournis par les conseillers agricoles. Les demandes de microprojets ne cessent d'augmenter malgré le changement de la procédure qui exigeait l'intégration de l'OTIV dans le financement des microprojets.

PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2009

PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P

Composante	Code	PTBA 2009							Décaissement au 30 Juin 2009							Execution en %							
		FIDA	GDM	Beneficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Beneficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Beneficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	
1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX	I							4 488,4							287,0								6,4%
1 - Appui aux unions gestionnaires des CAM	11	457,0	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	553,8	98,1	3,1	5,7	0,0	0,0	0,0	106,9	21,5%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,3%	
2 - Appui au développement des marchés et des partenariats	12	137,8	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1	72,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	52,8%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,8%	
3 - Désenclavement des pôles	13	0,0	509,7	224,5	0,0	2 575,6	75,6	3 385,4	0,0	0,3	3,8	0,0	100,4	0,0	104,4	0,0%	0,1%	1,7%	0,0%	3,9%	0,0%	3,1%	
4 - Fonds post-cyclonique	14	97,9	65,0	0,0	0,0	227,2	0,0	390,1	0,1	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,7	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	0,7%	
2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE	II							2 110,4							469,5							22,2%	
21 - Appui à la gouvernance locale et à l'Organisation Paysanne	21	328,9	102,5	0,0	0,0	206,7	0,0	638,1	162,8	0,2	0,0	0,0	6,2	0,0	169,2	49,5%	0,2%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	26,5%	
22 - Appui aux producteurs et micro-projets	22	803,7	138,4	88,0	48,2	366,7	0,0	1 444,9	280,1	1,4	0,0	0,0	15,4	0,0	296,9	34,9%	1,0%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%	20,5%	
23 - Recherche et développement	23	17,5	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	16,6%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,2%	
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS	III							557,1							172,1							30,9%	
31 - Accessibilité aux services financiers de proximité	31	414,3	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	468,2	137,5	9,1	1,3	0,0	0,0	0,0	147,9	33,2%	16,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,6%	
32 - Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	32	83,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	29,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	27,3%	
4. APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME	IV							656,2							271,6							41,4%	
41 - Gestion du programme UGP	41	513,7	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	617,4	225,6	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	254,4	43,9%	27,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	41,2%	
42 - Suivi Evaluation	42	34,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	16,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	49,5%	5,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	44,3%	
TOTAL		2 888,0	1 111,7	312,5	48,2	3 376,1	75,6	7 812,1	1 021,1	43,7	10,7	0,0	124,6	0,0	1 200,1	35,4%	3,9%	3,4%	0,0%	3,7%	0,0%	15,4%	

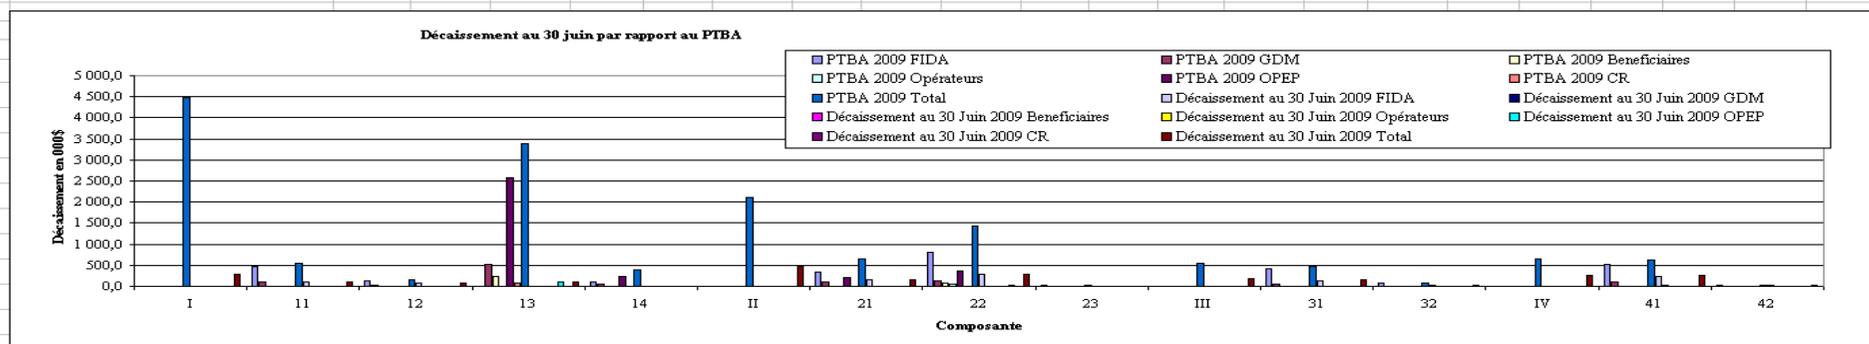


PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA (621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2009

PAYS : MADAGASCAR

PRETS FIDA: 621-MG

PRETS OFID: 970-P


Composante	Code	Plan de Financement total du Programme							Decaissement cumulé au 30/06/09						Execution en %							
		FIDA	GDM	Beneficiaires	Operateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Beneficiaires	Operateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Beneficiaires	Operateurs	OPEP	CR	Total
Appui aux développements des pôles et aux partenariats commerciaux	I	2 737,0	2 950,4	150,6	120,3	5 497,0	115,7	11 571,1	1 022,0	239,6	46,7	10,6	1 560,1	0,0	2 878,9	37,3%	8,1%	31,0%	8,8%	28,4%	0,0%	24,9%
Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive	II	6 098,6	1 001,8	791,1	112,9	1 183,6	0,0	9 188,1	1 656,0	83,2	60,3	2,9	350,8	0,0	2 153,2	27,2%	8,3%	7,6%	2,6%	29,6%	0,0%	23,4%
Appui aux services financiers	III	1 736,0	366,2	0,0	0,0	212,5	0,0	2 314,6	864,7	43,5	11,4	0,0	0,0	0,0	919,6	49,8%	11,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	39,7%
Appui à la gestion du Programme	IV	4 907,5	401,4	0,0	0,0	6,1	0,0	5 315,0	3 120,2	300,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 420,7	63,6%	74,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	64,4%
TOTAL		15 479,1	4 719,8	941,8	233,2	6 899,2	115,7	28 388,9	6 662,8	666,8	118,4	13,5	1 910,9	0,0	9 372,4	43,0%	14,1%	12,6%	5,8%	27,7%	0,0%	33,0%

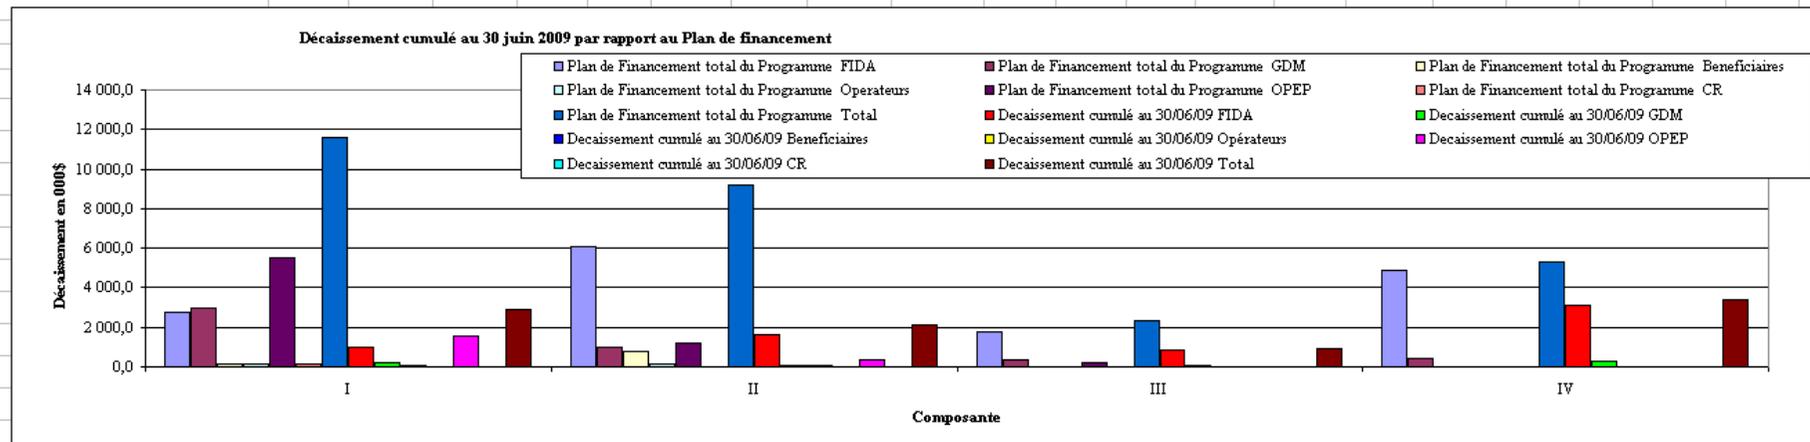

**PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2009**

**PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P**


Catégorie	Code	PTBA 2009							Decaissement au 30 Juin 2009							Execution en %							
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	
Genie civil	I							4 199,5							110,1								2,6%
Amenagement hydroagricoles	Ia	0,0	63,3	0,0	0,0	316,7	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Routes et pistes	Ib	0,0	496,8	224,5	0,0	2 483,9	75,6	3 280,8	0,0	0,0	3,8	0,0	71,3	0,0	75,0	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	2,9%	0,0%	2,3%	
Autres infrastructures	Ic	248,9	89,8	0,0	0,0	200,0	0,0	538,7	19,8	5,1	7,0	0,0	3,1	0,0	35,0	8,0%	5,7%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	6,5%	
Equipement et vehicules	II							124,1							84,0							67,7%	
Moyens de transport	IIa	35,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	41,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7	117,0%	82,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	111,2%	
Equipement, Mobilier	IIb	16,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	29,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	178,1%	68,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	158,4%	
Equipement de terrain	IIc	43,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	7,9%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	
Formation	III	338,9	71,8	0,0	0,0	60,8	0,0	471,4	65,7	0,5	0,0	0,0	5,6	0,0	71,8	19,4%	0,6%	0,0%	0,0%	9,2%	0,0%	15,2%	
Etudes	IV							208,2							45,8							22,0%	
Etudes marches internationaux	IVa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Autres etudes	IVb	86,1	34,6	0,0	0,0	87,6	0,0	208,2	3,1	0,7	0,0	0,0	42,0	0,0	45,8	3,6%	2,1%	0,0%	0,0%	48,0%	0,0%	22,0%	
Assistances Techniques	V							575,0							215,0							37,4%	
Assistances tech international	Va	147,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,8	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	47,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,6%	
Assistance tech nationale	Vb	384,3	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	427,2	144,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	144,7	37,5%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,9%	
Prestataires de services	VI	515,4	101,7	0,0	0,0	4,3	0,0	621,3	325,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	330,8	63,2%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	53,2%	
Fonds	VII							722,2			0,0				37,2							5,2%	
Fonds d'appui au CAM	VIIa	151,1	0,0	88,0	48,2	0,0	0,0	287,2	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	22,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	
Fonds de promotion de revenus	VIIb	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Fonds post cyclonique	VIIc	97,9	64,2	0,0	0,0	222,9	0,0	385,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,7	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,7%	
Microprojets	VIII	544,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	171,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	172,2	31,6%	25,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,5%	
Salaires et indemnites	IX	113,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	120,7	45,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	39,7%	7,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	37,8%	
Cout de Fonctionnement	X	113,4	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	223,7	65,7	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	57,9%	19,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	39,2%	
TOTAL		2 888,0	1 111,7	312,5	48,2	3 376,1	75,6	7 812,1	1 021,1	43,7	10,7	0,0	124,6	0,0	1 200,1	35,4%	3,9%	3,4%	0,0%	3,7%	0,0%	15,4%	

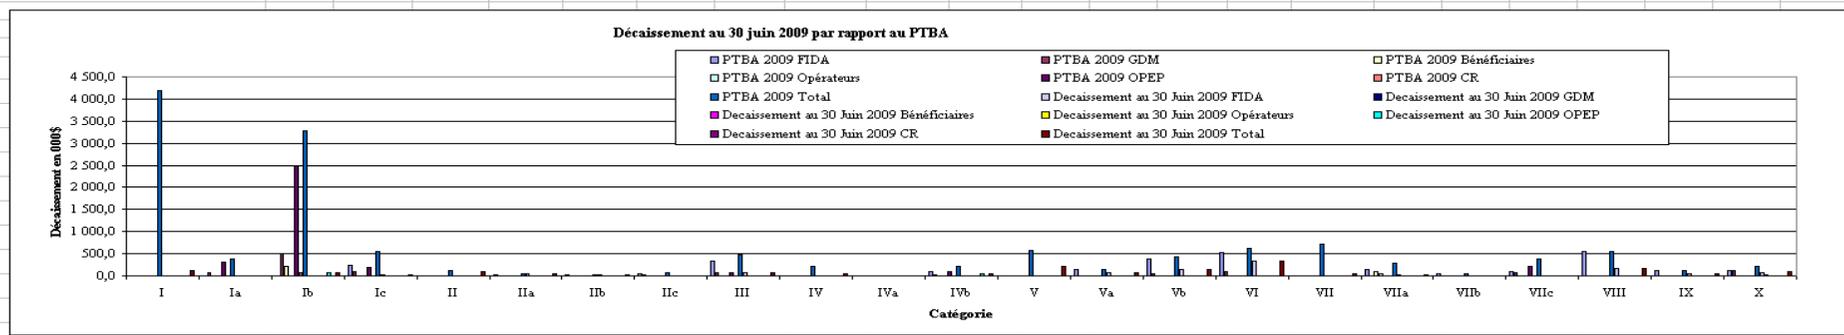

PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2009

PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P

Catégorie	Code	Plan de Financement							Decaissement cumulé au 30/06/09							Execution en %							
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	
Genie civil	I							10 475,8							2 248,4								21,5%
Amenagement hydroagricoles	Ia	0,0	260,6	120,9	0,0	719,7	0,0	1 101,2	0,0	25,4	0,0	0,0	139,7	0,0	165,1	0,0%	9,8%	0,0%	0,0%	19,4%	0,0%	15,0%	
Routes et pistes	Ib	0,0	2 442,0	135,3	0,0	4 797,1	115,7	7 490,1	0,0	170,8	25,7	0,0	1 292,9	0,0	1 489,4	0,0%	7,0%	19,0%	0,0%	27,0%	0,0%	19,9%	
Autres infrastructures	Ic	762,5	477,9	31,3	0,0	612,8	0,0	1 884,4	328,8	67,8	48,4	0,0	148,9	0,0	593,8	43,1%	14,2%	154,6%	0,0%	24,3%	0,0%	31,5%	
Equipement et vehicules	II							1 088,9							747,1								68,6%
Moyens de transport	IIa	289,8	127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	416,9	236,9	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	300,1	81,8%	49,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	72,0%	
Equipement, Mobilier	IIb	335,5	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	361,9	264,9	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,9	79,0%	109,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	81,2%	
Equipement de terrain	IIc	228,8	46,1	0,0	24,5	10,7	0,0	310,0	134,0	8,2	0,0	0,0	10,7	0,0	153,0	58,6%	17,8%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	49,3%	
Formation	III	1 677,5	41,6	0,0	0,0	42,1	0,0	1 761,2	639,9	10,8	0,0	0,0	33,3	0,0	684,0	38,1%	26,1%	0,0%	0,0%	79,2%	0,0%	38,8%	
Etudes	IV	411,8	128,3	5,8	10,6	372,5	0,0	929,0	225,8	28,2	0,0	10,6	220,9	0,0	485,4	54,8%	22,0%	0,0%	100,0%	59,3%	0,0%	52,3%	
Assistances Techniques	V							2 883,5							1 657,5							57,5%	
Assistances tech international	Va	800,6	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	942,7	447,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	447,9	55,9%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,5%	
Assistance tech nationale	Vb	1 913,9	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 940,9	1 169,5	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 209,7	61,1%	149,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	62,3%	
Prestataires de services	VI	3 263,6	739,8	71,1	85,2	87,2	0,0	4 246,8	1 321,7	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 360,3	40,5%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	32,0%	
Fonds	VII	1 006,5	15,7	533,0	110,0	257,2	0,0	1 922,4	447,1	17,6	0,0	0,0	64,4	0,0	529,1	44,4%	111,9%	0,0%	0,0%	25,1%	0,0%	27,5%	
Microprojets	VIII	2 287,6	0,2	44,4	2,9	0,0	0,0	2 335,1	463,4	2,4	44,4	2,9	0,0	0,0	513,1	20,3%	1060,5%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	22,0%	
Salaires et indemnites	IX	686,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	686,3	325,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	325,9	47,4%	1106,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,5%	
Coût de Fonctionnement	X	1 021,8	245,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 266,8	657,9	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	821,5	64,4%	66,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	64,9%	
Non alloué	XI	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
TOTAL		15 479,1	4 719,8	941,8	233,2	6 899,2	115,7	28 388,9	6 662,8	666,8	118,4	13,5	1 910,9	0,0	9 372,4	43,0%	14,1%	12,6%	5,8%	27,7%	0,0%	33,0%	

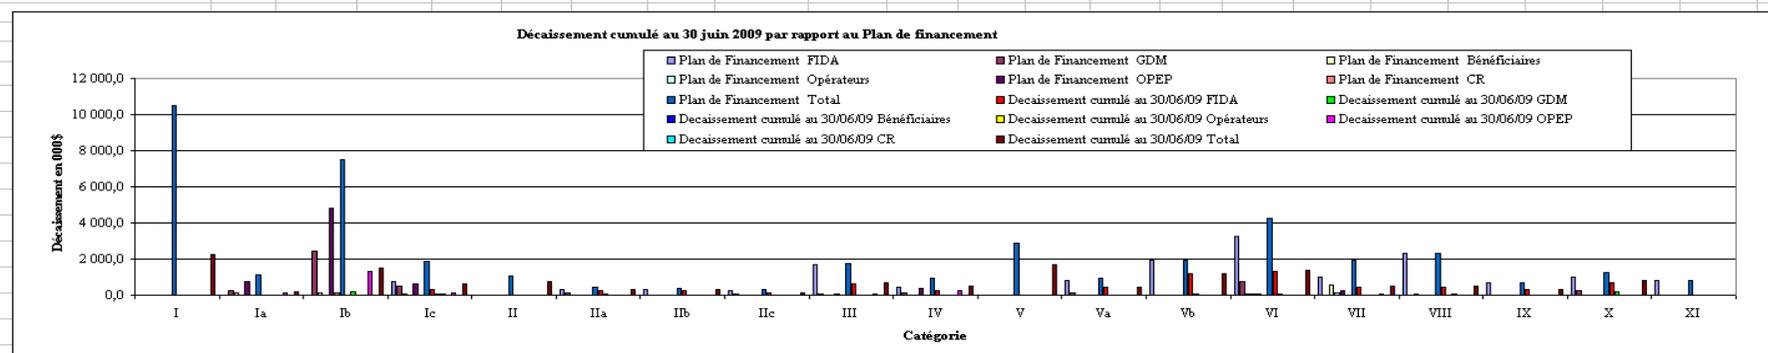

C. Annexes

Nota : les annexes financières sont les mêmes que celles utilisées dans les rapports de supervision.

C.1 Tableau de financement total du projet par catégories de déboursement du projet et par bailleur

(ref. fichier Excel)

C.2 Tableau de financement par composante, sous composante et par an, prévu et réalisé

(ref. fichier Excel)

C.3 Tableau de synthèse des indicateurs choisis pour le suivi des réalisations physiques par composante et sous composante

(ref. fichier Excel)

C.4 Tableau et graphe des réalisations physiques par composante pondérées par leurs réalisations financières respectives

(ref. fichier Excel)

C.5 Tableau des indicateurs choisis pour suivre la réalisation des objectifs de développement

(ref. fichier Excel)

C.6 Cadre logique complet du projet avec les indicateurs de suivi choisis

(réf. [Fichier](#) Word)
